

**ZWEITER ARBEITSBERICHT ZUM BAU EINES GEBÄUDES ZUR
VERARBEITUNG VON KARITÉNÜSSEN DURCH DEN VEREIN ACTIONS
DE SOLIDARITÉ FÜR DIE FRAUEN DES DORFES ASSODÈ IN DER
GEMEINDE OUAKE**

Mittwoch, 14. Juni 2023

Ab 7 Uhr morgens machten die Elektriker mit der Installation der Elektrokabel, der Erdkabel, der Kästen und Schränke am Gebäude weiter, damit die Frauen später auch nachts mit elektrischer Beleuchtung oder mit Hilfe eines Generators arbeiten können.

Die Elektriker haben den ersten Teil der Installation beendet und die letzten Arbeiten werden in wenigen Tagen abgeschlossen, wenn das Gebäude von den Maurern fertiggestellt ist.



Montag, 19. Juni 2023

Die Maurer begannen mit dem Verputzen des Gebäudes. Heute wurden zwei Wände im Inneren des Baus ohne die Hilfe eines Bevölkerungsteams verputzt. Einige Frauen aus dem Dorf waren auf der Baustelle, um Wasser für die Maurer zu bringen.



Dienstag, 20. Juni 2023


Sehr früh am Morgen begann es zu regnen. Gegen 11 Uhr konnten die Maurer mit den begonnenen Verputzarbeiten weitermachen und einige Wände im

Inneren des Gebäudes fertigstellen, ohne Hilfe der Männer aus dem Dorf. Sie kamen nicht, weil heute, wie jeden Dienstag, der Kassoua-Markt stattfindet. Herr Idrissou Yolou tat sein Möglichstes, damit die Maurer Wasser zum Arbeiten hatten.



Mittwoch, 21. Juni 2023

Wegen des Regens heute Morgen konnten die Maurer erst ab 11 Uhr weiterarbeiten. Sie verputzten die beiden Außenflächen der Pfeiler mit einer Mischung aus Sikalit, zum Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit bei Regen. Das Team aus der Dorfbevölkerung, das die Maurer unterstützen soll, kam nicht, weder Männer noch Frauen, weil es geregnet hatte und alle auf die Felder gingen. Wieder einmal fanden Herr Idrissou Yolou und ein junger Mann eine Lösung für das Heranschaffen von Wasser für die Maurer mit Hilfe eines Dreiradfahrers.

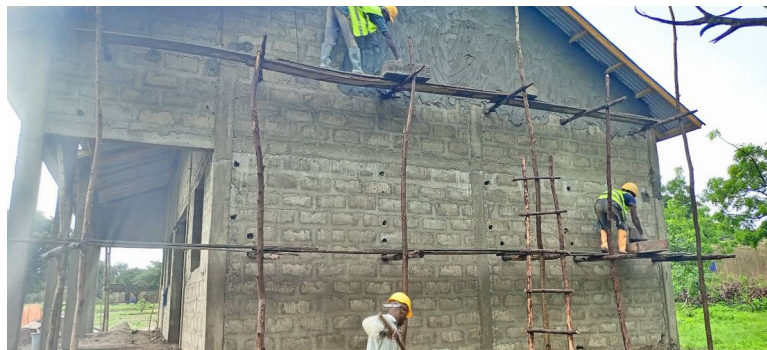

Donnerstag, 22. Juni 2023

Gegen 4 Uhr morgens trafen Herr Benoit D. Ahlonsou, 1. Vorsitzender des Vereins Actions de Solidarité, Herr Armand Agossa, der Schatzmeister des Vereins, und Herr Christian, der Fahrer, auf der Baustelle ein, um den Fortschritt der Bauarbeiten zu kontrollieren. Zeitgleich wurden die Türen und Fenster geliefert. Zwischen 6 und 9 Uhr regnete es. Nach dem Regen machte sich die Delegation auf den Rückweg nach Calavi. Die Maurer begannen mit der Arbeit und setzten alle Türen und Fenster im Gebäude ein.



Freitag, 23. Juni 2023

Um 8 Uhr begannen die Arbeiten und das Team kam mit den Verputzarbeiten an der Außen- und Innenseite des Gebäudes gut voran. Da die Helfer aus der Bevölkerung für die Maurer nicht kamen, haben die Frauen weitere Dorfbewohner angefordert, um das fehlende Team zu vertreten. So kamen sie mit ihren Aufgaben gut voran. Die Frauen holten Wasser und brachten es zur Baustelle, und zwei Männer halfen den Maurern.



Samstag, 24. Juni 2023

Ab 8 Uhr kommen die Verputzarbeiten an der Veranda des Gebäudes sehr gut voran. Das Bevölkerungsteam ist vor Ort, um Wasser zu bringen.

Sonntag, 25. Juni 2023

Das Maurerteam kommt mit den Verputzarbeiten auf der Baustelle unter der Leitung von Herrn Bruno sehr gut voran. Das Team aus der Dorfbewölkerung ist auch anwesend, um den Maurern Wasser zu bringen, aber das Team der Bevölkerung, das den Maurern helfen sollte, ist nicht gekommen.



Montag, 26. Juni 2023

Auf der Baustelle werden heute einige Pfeiler fertiggestellt, auch einige der Fenster werden fertig. Das Team der Frauen aus der Bevölkerung ist da, um reichlich Wasser zu herbeizubringen, Männer sind jedoch nicht gekommen.



Dienstag, 27. Juni 2023

Die letzten Verputzarbeiten am Gebäudes kommen sehr gut voran. Auch für Fenster und Türen werden die Abschlussarbeiten durchgeführt. Das Helferteam für die Maurer kam nicht, aber die Frauen sind da, um den Maurern Wasser zu bringen. Danach gingen sie zum Kassoua-Markt.



Mittwoch, 28. Juni 2023

Sehr früh am Morgen haben die Maurer damit begonnen, den Boden für die beiden kleinen Räume des Gebäudes und der Veranda zu legen, und die Zementierung ist abgeschlossen. Die Frauen kamen, um Wasser zu bringen, dann gingen sie nach Hause, um sich auf das Tabaski-Fest vorzubereiten. Von den Männern aus dem Dorf kam niemand.



Donnerstag, 29. Juni 2023

Sehr früh am Morgen begannen die Maurer damit, die Haupthalle des Gebäudes für die Zementierung zu begradigen. Das Männerteam aus dem Dorf wird durch vier junge Leute vertreten, zusätzlich zu den Frauen, die Wasser auf die Baustelle bringen. Gemeinsam werden die Zementierungsarbeiten ausgeführt.



Freitag, 30. Juni 2023

Heute zementierten die Maurer die Rampe zur Tür des Haupteingangs des Gebäudes. Die Stufen zum Büro wurden verputzt, ebenso die Blumenbeete vor der Gebäudefront. Auch die Diebstahlschutzgitter im Büro und im Lager wurden gesetzt.



Samstag, 1. Juli 2023

Der Chefmaurer Herr Bruno nutzte diesen Tag, um rund um das Gebäude zu überprüfen, ob es irgendwelche Mängel gibt, die korrigiert werden müssten. Es wurden kleinere Korrekturen vorgenommen. Danach reinigten die Arbeiter ihre Arbeitsmaterialien und räumten sie weg.



Sonntag, 2. Juli 2023

Herr Roméo, der Chefelektriker, kam mit seinem Kollegen, um im Gebäude Sonnenkollektoren, Glühbirnen, Schalter und Steckdosen zu installieren.



Montag, 3. Juli 2023

Heute kamen alle Teams zurück, die am Bau des Gebäudes beteiligt sind, das der Verein Actions de Solidarité für die Frauen des Dorfes Assodè errichtet. Hier werden die Maschinen, die zur Verarbeitung von Sheanüssen zu Butter nötig sind, untergebracht werden. Das Malerteam wird in den kommenden Tagen das Gebäude streichen.



Berichterstatter: Jean Azombakin
