

アボメ・カラヴィ郡 アゴンメー公立小学校
合計 6 教室、事務所、倉庫を擁する 2 棟の建物の建築
および 8 つの個室を擁する 1 棟のトイレの設置に関する
作業報告書その1

2023 年 9 月 19 日火曜日

私たちはアゴンメーの住民と学校の保護者会のメンバーを総会に招待しました。地域の責任者、地方の代表者、村の長老たち、教職員、そして NPO “Actions de Solidarité” のメンバーの前で、契約に賛成票を投じるために人々は大勢到着しました。

これにより、工事が始まりました。2 人のバイヤーは、遣り方に使われるの板とチーク材の小さな丸太の購入に向かいました。



2023 年 9 月 20 日水曜日

両方の建物の遣り方を作成しました。





2023 年 9 月 21 日木曜日

砂と鉄筋が建設現場に到着します。

鉄筋工はすぐに作業を開始し、基礎に入れる鉄芯を加工します。



2023 年 9 月 22 日金曜日

住民は基礎の溝を掘る作業を開始します。

4トンのセメントが納品された後、レンガ工はコンクリートブロックの製造を開始します。




2023 年 9 月 23 日土曜日

掘削作業は順調に進んでいます。2 つ目のチームはトイレの穴を掘り始めました。レンガ工が建築用ブロックを着々と製造しています。

2023 年 9 月 25 日月曜日

建物の基礎溝が完成しました。柱が組み込まれる基礎溝をレンガ工がさらに拡張します。鉄曲げ工は懸命に働き、レンガ工はブロックを作りつづけています。トイレの穴の掘削も重労働です。砂利が納品されました。

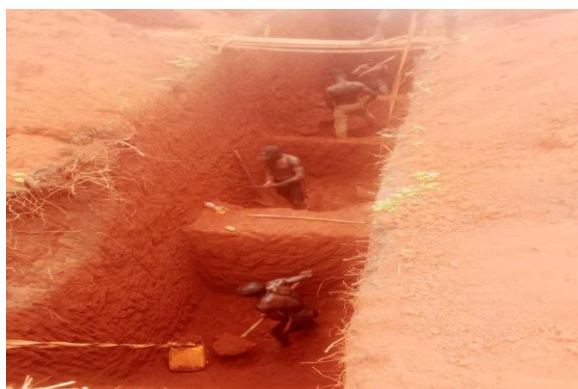

2023 年 9 月 26 日火曜日

コンクリートの最初の層が基礎溝に流されます。
その上には柱の支えとなる「象の足」が置かれています。





2023 年 9 月 27 日水曜日

2 棟目の建物では、鉄筋の上にコンクリートの 2 層目を打ちました。
最初の建物では、コンクリートの最初の層が基礎溝に流されます。

2023 年 9 月 28 日木曜日

- セメントと砂が納品されました。
- 最初の建物でもコンクリートの 2 層目が打たれました。
- 2 棟目の建物ではすでに基礎壁が建設されています
- 2 人の鉄筋工長が、下部の鉄アンカー用の配筋作業を行っています。

私たちは従業員全員を励まします。



金曜日、2023 年 9 月 29 日

2 棟番目の建物に下部の鉄アンカーが打設されます。
最初の建物の基礎壁が作られています。



2023 年 9 月 30 日土曜日

最初の建物で基礎壁が完成しました。鉄筋工は、下部の鉄アンカー用の配筋を済ませます。

2 棟目では下部鉄アンカーの型枠が撤去され、村人達が基礎壁までブロックを運びます。

2023 年 10 月 2 日月曜日

最初の建物では、下部の鉄アンカーの型枠が設置され、コンクリートが打たれました。

2 棟目の壁は窓まで建てられました。窓の開口部下辺の小さな鉄アンカーが打たれました。



2023 年 10 月 3 日火曜日

アボメ・カラヴィ郡の技術部のアゴッスー・ジェロミンさんが建設現場を視察に来ました。彼女は建設現場について次のように書いています。

《アボメ・カラヴィ郡庁舎の監視 & 管理部門の責任者がアゴンメー小学校を訪れ、教室が 3 つずつ、事務所と倉庫が 1 つ、8 個室のトイレを持つ 2 棟の建物の建設工事を視察した。観察によると、建設作業は順調に進んでいる。

- 十分な労働者。
- 多数の建築資材。

- 豊富な砂利、鉄、砂。
- 満足な成果。

両棟の工事進捗状況；

- 下部の鉄アンカーが打設された。
- 配筋が準備されている。

2023 年 10 月 3 日火曜日

2 棟目のベランダの柱は夕方までに打設予定です。

最初の建物では、窓の開口部の下に小さな鉄のアンカーが打設されています。



2023 年 10 月 4 日水曜日

2 棟目の壁が窓の上辺まで建てられたため、壁の支柱部分にコンクリートが打たれました。

1 棟目ではベランダの柱を打設中です。一部の壁が窓の上辺まで達しています。



2023 年 10 月 5 日木曜日

2 棟目の上部の鉄アンカーが一括で打設されました。

1 棟目の壁の柱にもコンクリートが流されました。



トイレの掘削工事が進んでいます。今日は 4.50m に到達しました。



2023 年 10 月 6 日金曜日

1 棟目の上部の鉄アンカーが打設されました。

2 棟目では、上部の鉄アンカーの上にブロックが 4 列追加されました。屋根のために壁が延長されました。

どちらの建物のためにも、コンクリートブロックが追加製造されました。



2023 年 10 月 7 日土曜日

1 棟目でも、上部の鉄アンカーの上にブロックが 4 列追加されました。屋根のための壁の延長工事が行われています。

2 棟目では、屋根の下 の 4 番目の鉄アンカーが打設されました。

今日はトイレの掘削作業はありませんでした。

2023 年 10 月 9 日月曜日

1 棟目にも、屋根の下 の 4 番目の鉄アンカーが打設されました。

夕方までに 2 棟目に 4 つの破風が建てられる予定です。セメントが買えなかったため、現場での作業が妨げられました。時間を無駄にしないために、基礎溝が砂で埋められます。

2023 年 10 月 10 日火曜日



1 棟目では、4 番目の鉄アンカーの残りが打設されています。

2 棟目では、破風の上の柱端にコンクリートが流されました。

注記：盗難防止の壁が作られています。



2023 年 10 月 11 日水曜日

今朝、NPO “ACTIONS DE SOLIDARITE” の常務理事が来訪しました。彼女は建設現場の労働者に賢明なアドバイスを与えます。昨日からセメントが不足しているため、レンガ工たちはブロック製造の代わりに校舎の花壇を作りました。また、1 棟目では 4 番目の鉄アンカーの型枠が外されました。

2023 年 10 月 12 日木曜日

セメント不足のため、建設作業を続けることができません。その時間を利用して階段を準備したり、花壇を作ったりします。

レンガ工は深さ 5 メートルのトイレの穴を整えました。

2023 年 10 月 13 日金曜日

ついにセメントが納品されました。建設スタッフは喜んで仕事に取り組んでいます。

住民は建物の床を土で埋める作業を開始しました。

2023 年 10 月 14 日土曜日

1 棟目には 4 つの破風が建てられています。また、いくつかの柱が打設されました。

2 棟目では階段が作成されました。

トイレではコンクリートの最初の層が打設されました。穴には 8 つの支柱を組み込みます。



2023 年 10 月 16 日月曜日

1 棟目では 5 番目の破風が建設中です。盗難防止用の小さな壁も建ちました。階段が製作中です。

トイレの穴は 1 番目の鉄アンカーまで壁が建てられています。



2023 年 10 月 17 日火曜日

1 棟目では、車いす用のスロープが建設中です。

トイレでは、最初の鉄アンカーが施工されています。

2 棟目では、階段の鉄の支柱が打設され、車いすスロープ用の基礎溝が掘られています。



2023 年 10 月 18 日水曜日

砂が到着しました。1 棟目では、スロープ用の基礎壁に鉄アンカーが打設されます。花壇が作られています。2 棟目ではスロープの柱を準備中です。

トイレでは壁が 2 番目の鉄のアンカーまで延長されています。

2023 年 10 月 19 日木曜日

砂利が納品されました。最初の建物の階段はすべて鋳造されています。

2 棟目では、スロープの基礎に鉄アンカーが打設されます。

トイレでは、2 番目の鉄アンカーが施工されます。

さらに厚さ 15cm のコンクリートブロックを作ります。

2023 年 10 月 20 日金曜日

トイレの穴の壁にシカリットとシカルテックスが塗装されました。

2023 年 10 月 21 日土曜日

トイレの穴をコンクリートで閉じる工程です。



2023 年 10 月 23 日月曜日

トイレの穴を閉じた上に壁が構築されていきます。

2023 年 10 月 24 日火曜日

トイレ棟が完成しました。



2023 年 10 月 25 日水曜日

トイレの入口を製作中です。

2023 年 10 月 26 日木曜日

鉄筋工は階段の配筋を済ませました。

2023 年 11 月 2 日木曜日

全ての壁工事が完了しました。

教室内の土の充填作業が停滞しています。

勧告: 住民を激励するため、地域の責任者はこのことを知らされるべきでしょう。

アゴッスー・ジェロニム

2023 年 11 月 25 日と 27 日

屋根板が納品されました。

屋根構造用の板が購入され、製材所で大工が作業しています。



2023 年 12 月 4 日月曜日

便器が納品されました。

ドアと窓のシャッターも現場に到着しました。



2024 年 12 月 7 日木曜日

女性たちは教室を砂で埋めています。



2023 年 12 月 19 日火曜日

2 棟目の梁を製作中です。



2023 年 12 月 20 日水曜日

2 棟目: 梁が 完成し、桁が設置されています。

1 棟目: 住民が砂の充填作業を進めています。

2023 年 12 月 21 日木曜日

2 棟目: すべての桁が設置されました

1 棟目: 引き続き教室の充填作業が進められています。



2023 年 12 月 22 日金曜日

1 棟目: 11 の窓シャッターが設置されました。

大工さんが梁を施工しています。

教室の充填作業が続きます。



2023 年 12 月 23 日土曜日

人々はまだ充填作業で忙しくしています。

2 棟目: 屋根の構造が完成し、屋根板が設置されています。夕方には完成する予定です。



2023 年 12 月 25 日月曜日

週末の間に大工たちは 1 棟目の梁を作り、今日は桁を設置しています。

2023 年 12 月 26 日火曜日

1 棟目の屋根構造が完成しました。滑らかな 6 ゲージの鉄の棒で建物に固定されています。

2 棟目では窓シャッターを設置中です。





2023 年 12 月 27 日水曜日

- 1 棟目:屋根板がネジ止めされています。
- 2 棟目:建物の正面にドアと窓シャッターが設置されています。

2023 年 12 月 28 日木曜日

- 1 棟目の屋根も完成しました。すべてのドアと窓シャッターが所定の位置にあります
トイレの屋根はトタン板で作られました。



報告者:

ロコ・ジョセフ
