

**1. ARBEITSBERICHT
ZUM BAU VON 1 GEBÄUDE MIT 3 KLASSENZIMMERN, BÜRO UND
LAGERRAUM
UND TOILETTEN MIT ACHT KABINEN
FÜR DIE ÖFFENTLICHEN GRUNDSCHULE VON AMOUSSENON-TOMÉ
IN DER GEMEINDE VON ZE**

Dienstag, 28. März 2023

Um 15 Uhr findet in Amoussenon-Tomé eine Vollversammlung statt.

Die Bevölkerung ist durch einige Dorfbewohner und Persönlichkeiten vertreten: dem Dorfvorsteher, dem Direktor und den Mitgliedern des Elternbeirats. Der Vertrag wurde vorgelesen und die darin aufgeführten Bedingungen durch eine Abstimmung angenommen. Danach besichtigten alle das Baugelände, der Lagerraum für die Materialien sowie der Raum für die Unterbringung der Arbeiter waren bereits vorbereitet .

Mittwoch, 29. März 2023

Heute wurden Bretter und kleine Teakholzstämmen eingekauft. Anschließend wurde die topografische Vermessung für das neue Gebäude vorgenommen, um die Basis zu dem alten Gebäude zu bestimmen. Schließlich wurde das Schnurgerüst gestellt.

Donnerstag, 30. März 2023

Die Helfer aus dem Dorf begannen mit dem Aushub der Fundamentgräben für das Gebäudes. Der Dorfvorsteher kam vorbei, um die Männer bei ihrer Arbeit anzuspornen.



Freitag, 31. März 2023

Zuerst habe ich Lagunensand auf der Baustelle in Empfang genommen. Auch Zement wurde angeliefert. Die Aushubarbeiten für die Fundamentgräben gingen weiter.

Samstag, 1. April 2023

Die Herstellung der Ziegel für das Fundament wurde begonnen. Nachdem ein Regen zunächst die Arbeiten ausgebremst hat, konnten die Maurer 2,5 Tonnen Ziegel herstellen.

Der vom Verein AS vor einigen Monaten erstellte Wasserturm hat die Wasserversorgung auf der Baustelle wesentlich vereinfacht.

Montag, 3. April 2023

Heute haben die Maurer zwei Tonnen 15-er Vollziegel für das Fundament des Gebäudes hergestellt.

Die Aushebung der Fundamentgräben seitens der Bevölkerung kommt nur langsam voran.

Dienstag, 4. April 2023

Die Maurer und Eisenbieger kommen gut mit ihren Arbeiten voran. Die Maurer haben 2,5 Tonnen 15-er Vollziegel und 2,5 Tonnen 15-er Hohlziegel hergestellt.

Mittwoch, 5. April 2023

Alle Arbeiter sind auf der Baustelle. Der Eisenbieger hat mit der Herstellung des Eisengerüsts für das Fundament begonnen. Im Laufe des Tages haben die Maurer 1 Tonne 15-er Vollziegel und 3 Tonnen 15-er Hohlziegel hergestellt.



Donnerstag, 6. April 2023

Der Aushub für die Fundamentgräben des Gebäudes geht weiter. Die Wasserversorgung wird dadurch erleichtert, dass wir Wasser direkt aus dem Bohrloch direkt neben der Baustelle holen. Nur der Transport des Stromaggregats, der dazu täglich vor Ort sein muss, stellt ein Problem dar.

Freitag, 7. April 2023

Der Aushub der Fundamentgrube geht weiter. Einige Männer sind gekommen, um die Arbeit fertigzustellen. Die Maurer erweitern die Stellen für die Eiseneinlagen.



Samstag, 8. April 2023

Dam frühen Morgen sind die Frauen des Dorfes sehr zahlreich zur Baustelle gekommen und haben Ziegel an die Fundamentgräben gebracht. Die Gräben wurden heute Morgen fertiggestellt, die Maurer haben sie ausgeglichen und mit dem Eingießen von bewehrtem Beton begonnen. Der Eisenbieger hat mit der Einbettung der Eiseneinlagen und Pfeiler für das Fundament begonnen. Gegen 16 Uhr hat ein sintflutartiger Regen eingesetzt und die Arbeiten wurden eingestellt.



Montag, 10. April 2023

Seit voriger Woche erhielten wir immer weniger Sandlieferungen. Ich habe die Exekutivdirektorin des Vereins informiert. Frau Astrid Toda musste Sand bei einem anderen Sandgrube bestellen. Nach und nach wird der bewehrte Beton eingegossen.

Dienstag, 11. April 2023

Die Frauen aus dem Dorf haben wieder Ziegel zu den Gräben getragen. Die Maurer füllten immer noch bewehrten Beton ein. Der Eisenbieger kümmerte sich um die Herstellung des unteren Ringankers. Der Maurer und der Eisenbieger setzen die Pfeiler des Gebäudes.



Mittwoch, 12. April 2023

Heute um 15:30 Uhr hatten der Maurer Gérard, der 1. Vorsitzende des Vereins AS und ich eine Sitzung mit einigen Elternvertretern der Schule. Wir haben sie sensibilisiert, damit sich die Bevölkerung in kleinen Gruppen organisiert, um abwechselnd auf der Baustelle zu arbeiten. Sie haben versprochen, ab morgen regelmäßig da zu sein. Der 1. Vorsitzende des Vereins AS versprach vorbeizukommen, um das zu kontrollieren. Der Maurer und Einkäufer werden als Beweis Bilder und Videos schicken.

Die Maurer begannen mit der Errichtung der Mauern des Fundaments. Nachdem Sand in letzter Zeit knapp war, wurde heute Sand von 10-Rad Lastwagen angeliefert.

Donnerstag, 13. April 2023

Nach dem gestrigen Treffen mit 1. Vorsitzenden des Vereins AS und einigen Elternvertretern, ist die Bevölkerung heute stark motiviert, die Grube für die Toiletten auszuheben. Die jungen Frauen bringen den Maurern Ziegel, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Der Maurer, der Eisenbieger und der Verschaler erstellen den unteren Ringanker (erster Ringanker des Gebäudes).

Am Ende des Tages ist die Gruben für die sanitären Anlagen schon einen Meter tief. Ohne die Unterstützung des 1. Vorsitzenden des Vereins AS wäre das heute nicht möglich gewesen. Warten wir die nächsten Tage ab, wie sich das Engagement der Bevölkerung von Amoussenon-Tomé entwickeln wird.

Bravo! dem 1. Vorsitzenden des Vereins AS.

Bravo! der Bevölkerung, die zeigt, dass sie Verantwortung übernimmt.



Freitag, 14. April 2023

Die Arbeit in der Toilettengrube gehen weiter. Eisen wurde angeliefert. Der untere Ringanker wurde fertiggegossen. Über dem Ringanker wurden einige Mauern errichtet.

Samstag, 15. April 2023

Die Mauern auf dem unteren Ringanker sind der gesamten Länge nach gesetzt. Der Eisenbieger legt die Eiseneinlage des kleinen Ankers unterhalb der Fensteröffnungen (d.h. des zweiten Ringankers). Im Laufe des Tages wurden heute weitere 15-er Hohlziegel hergestellt.



Montag, 17. April 2023

Der Zwischenanker wird mit Beton gegossen.

NB: Leider ist von der Bevölkerung seit letztem Samstag wieder niemand gekommen, was schade ist.

Dienstag, 18. April 2023

Die Eiseneinlagen für die Pfeiler der Veranda werden vom Eisenbieger verlängert. Der Verschaler zieht die Metallformen fest. Die Arbeiten an den Mauern gehen weiter.



NB: Seit voriger Woche ist der Preis für Zement gestiegen. Ich muss weit fahren, um welchen zu kaufen, was etwas beschwerlich ist für mich.

Mittwoch, 19. April 2023

Heute Morgen sind die Frauen aus dem Dorf wieder gekommen. Sie haben Ziegel hergetragen und haben mit dem Auffüllen der Veranda vor einem Klassenzimmer begonnen. Der Verschaler hat die restlichen Metallformen für die Verandapfeiler festgezogen. Diese und weitere Pfeiler werden in Beton gegossen. Ein Starkregen hat heute die kleine Mauer hinten im Gebäude zum Wasserturm hin zum Einsturz gebracht. Sie wird nach dem Wolkenbruch schnell wieder aufgebaut.

Donnerstag, 20. April 2023

Wir haben Bretter für den oberen Ringanker gekauft und zum Sägewerk gebracht (Ringanker über dem Fenstersurz). Da die Stromversorgung im Sägewerk nicht den ganzen Tag funktioniert hat, konnte der Verschaler nicht den ganzen oberen Ringanker verschalen. Die Maurer sind mit dem Betongießen der restlichen Pfeiler gut vorangekommen

Montag, 24. April 2023

Der obere Ringanker wurde vergangenen Freitag vollständig verschalt und in Beton gegossen. Heute wird er teilweise entschalt.

Dienstag, 25. April 2023

Die Mauer über dem oberen Ringanker wird errichtet. Der Eisenbieger legt das Eisengerüst für den letzten Ringanker unterhalb des Daches auf diese Mauer, die aus vier Reihen Ziegel besteht.

Mittwoch, 26. April 2023

Die Mauer über dem oberen Ringanker wird weitergesetzt. Eine weitere Seite des Gebäudes ist fertig.

Donnerstag, 27. April 2023

Der Eisenbieger verlängert die Pfeiler. Einige Teile des Ankers werden verschalt. Fast alle Mauern über dem oberen Ringanker sind fertig.

Freitag, 28. April 2023

Alle Mauern über dem oberen Ringanker sind errichtet. Die letzte Teile des Ringanker werden verschalt. Einige Pfeiler werden ebenfalls verschalt.



Samstag, 29. April 2023

Die Ringanker werden verschalt und gegossen, ebenso einige Pfeiler.

Montag, 1. Mai 2023

Heute werden auf vier Seiten die Giebel errichtet. Ein heftiger Regen bremste die Arbeiten etwas aus.

Dienstag, 2. Mai 2023

Die Bevölkerung hebt die Toilettengrube aus.

Die Stufen des Gebäudes wurden begonnen.



Mittwoch, 3. Mai 2023

Alle Giebel des Gebäudes sind fertig. An den Giebeln werden die Enden der Pfeiler gegossen. Der Eisenbieger erstellte Eisenkonstruktionen, um die Stufen auf beiden Seiten mit dem Gebäude zu verbinden.

Die Bevölkerung suchte Fachleute, um mit dem Aushub der Toilettengrube weiterzumachen, die heute eine Tiefe von 2,60 m erreichte.

Donnerstag, 4. Mai 2023

Der Aushub für die Toiletten ist heute nicht vorangekommen. Der 1. und die 2. Vorsitzende und einige Mitglieder des Vereins sind gekommen, um die Baustelle zu besichtigen und über andere Projekte rund um die Schule zu sprechen.

NB: Abends besuchte Frau Sandie Brayard die Baustelle. Sie ist für die Schulung der Mitglieder des Vereins in Verwaltungsthemen zuständig.

Freitag, 5. Mai 2023

Die Frauen haben Ziegel zum Gebäude gebracht. Diese Ziegel werden zum Bau der Rampe verwendet.

Samstag, 6. Mai 2023

Der Bau der Rampe hat begonnen.

Die Arbeiter für den Aushub der Toiletten sind nicht gekommen. Auch die Helfer für die Maurer kommen nicht mehr.



Montag, 8. Mai 2023

Der Ringanker für die Rampe ist fertig. Die Verschalung des gesamten Ringankers wurde gemacht und gegossen.

Dienstag, 9. Mai 2023

Weitere Stufen wurden in Beton gegossen. Die Stufen, die gestern gemacht wurden, werden entschalt. Die Blumenbeete werden gemacht. Nach einem Besuch der Exekutivdirektorin auf der Baustelle, kamen einige Frauen vom Dorf, um die Stufen aufzufüllen.



Mittwoch, 10. Mai bis Dienstag 16 Mai 2023

Die Arbeiter des Vereins wurden für andere Projekte hier in Amoussenon-Tomé abgezogen.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Ich habe farbige asbestfreie Eternitplatten auf der Baustelle in Empfang genommen. Bei der ersten Fahrt konnte der Transporter 200 Platten transportieren. Bei der zweiten Fahrt konnte der Transporter 180 Platten transportieren. Insgesamt habe ich also 380 Eternitplatten erhalten, davon sind 9 in einem sehr schlechten Zustand, und müssen morgen ersetzt werden.



Donnerstag, 18. Mai 2023

Die Bevölkerung ist heute Morgen gekommen, um mit den Aufschütтарbeiten weiterzumachen. Die Veranda wurde aufgefüllt. Die Frauen konnten auch mit dem Auffüllen eines Klassenraums beginnen. Die Grube für die Toiletten erreicht eine Tiefe von fast 3 m.



Donnerstag, 18. bis Montag, 29. Mai 2023

Auch während dieser Zeit werden die Arbeiter wieder für andere Projekte des Vereins AS hier in Amoussenon-Tomé abgezogen.

Dienstag, 30. Mai 2023

Trotz der Intervention des 1. Vorsitzenden des Vereins AS, die Bevölkerung für ihren Anteil an den Arbeiten auf der Baustelle zu sensibilisieren, haben sie beschlossen, mit dem Aushub für die Toiletten bei einer Tiefe von 4 m aufzuhören. Für diese faule Bevölkerung war es gar nicht so einfach, bis in diese Tiefe zu graben. Es war für sie eine lästige Pflicht.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Heute Morgen begann der Maurer mit dem Gießen von bewehrtem Beton für die Toiletten. Die Eisenfundamente und Pfosten werden erstellt.



Donnerstag, 1. Juni 2023

Die Mauern der Toiletten werden bis auf 6 Reihen 15-er Vollziegel hochgezogen.

Freitag, 2. Juni 2023

In den Toiletten wird der erste Ringanker über den 6 Reihen Ziegel gelegt, verschalt und dann in Beton gegossen.



Samstag, 3. Juni 2023

Die Maurer errichten die zweite Mauerebene über dem ersten Ringanker in den Toiletten. Wegen starken Regens mussten die Arbeiten von 12 bis 14 Uhr eingestellt werden. Danach wurde die Mauer fertig gestellt. Außerdem wurden drei Fuhren Auffüllsand angeliefert.


NB: Ich muss erwähnen, dass sich die Bevölkerung nicht mehr an den Auffüllarbeiten beteiligt, und seit Beginn des Baus der Toiletten auch sonst keine Hilfe mehr leistet.

Montag, 5. Juni 2023

Der zweite Ringanker wird gelegt, verschalt und in Beton gegossen.

Dienstag, 6. Juni 2023

Die Mauer über dem zweiten Ringanker der Toiletten wird errichtet. Wegen starken Regens mussten die Arbeiten von 14:30 bis nach 18 Uhr eingestellt werden.

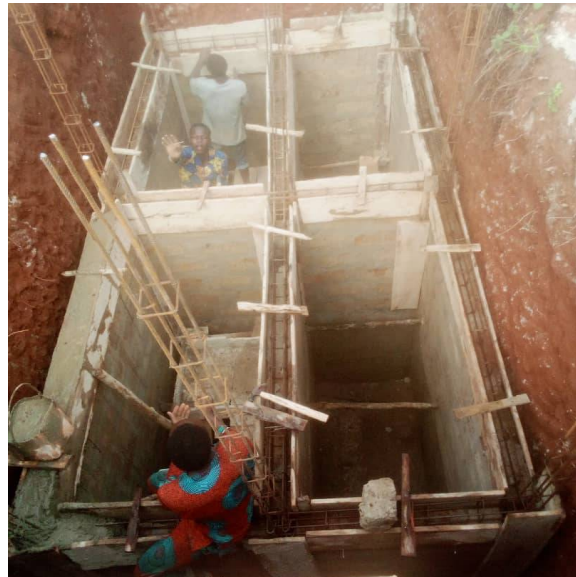

Mittwoch, 7. Juni 2023

Die Mauer unter dem dritten Ringanker wird fertiggestellt. Der dritte Ringanker gelegt. Die Mauer muss zuerst trocknen, ehe der Ringanker verschalt werden kann.



Donnerstag, 8. Juni 2023

Der dritte Ringanker und die Eisenbefestigungen für die Deckplatte für die Toiletten werden verschalt. Danach wird der innere Verputz der Toilettengruben mit Sikalite und Sikalatex angebracht.



Freitag, 9. Juni 2023

Zwei der vier Grubenfächer sind verputzt. Die Exekutivdirektorin musste für das Auffüllen des Gebäudes Arbeiter einstellen, weil die Dorfbewohner ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen und damit das Projekt innerhalb des Zeitplans beendet werden kann.




Samstag, 10. Juni 2023

Die beiden letzten Grubenfächer der Toiletten wurden verputzt.

Montag, 12. Juni 2023

Das von der Exekutivdirektorin eingesetzte Team beendet die restlichen Auffüllarbeiten.

Der Eisenbieger bereitete die Eisenbefestigung für die Toilettenplatte vor. Anschließend wurde die Platte verschalt und einbetoniert.

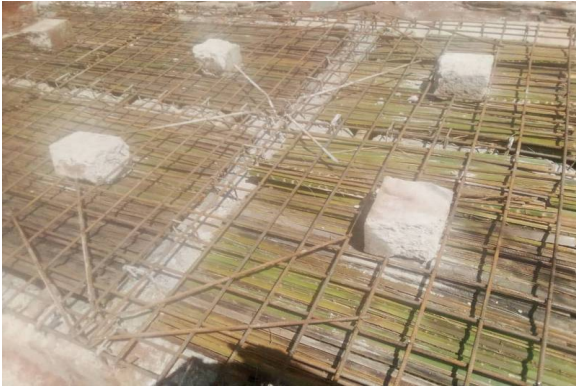

Dienstag, 13. Juni 2023

Die Wände von acht Toilettenkabinen werden bis zur Höhe des Türingankers errichtet.



Mittwoch, 14. Juni 2023

Der Ringanker und die Verschalung über den Türen wurden vom Eisenbieger und dem Verschaler gemacht. Anschließend begann der Maurer mit dem Betonieren.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Die Giebel des Toilettenblocks wurden errichtet. Der bewehrte Beton für die Stufen der Toiletten wird vorbereitet. Eine Seite des Toilettenblocks ist fertig. Die Vorbereitung des bewehrte Beton für die zweite Seite wurde gerade begonnen, musste dann aber wegen eines starken Regens eingestellt werden.



NB: die Türen, Fenster und Fenstergitter für das Schulgebäude und den Toilettenblock wurden angeliefert, ebenso die Fensterkeile. Es regnete bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Freitag, 16. Juni 2023

Der Maurer begann mit dem Setzen und Befestigen der Fenster der Schule.

Samstag, 17. Juni 2023

Die Einbruchsicherungen für das Gebäude der öffentlichen Grundschule Amoussenon-Tomé wurden angeliefert.

Montag, 19. Juni 2023

Heute hat wieder Regen die Arbeiten behindert.

Dienstag, 20. Juni 2023

Heute ist der Zimmermann gekommen. Das Giebelgebälk wird im Schulgebäude montiert.



Mittwoch, 21. Juni 2023

Der Aufbau der Querbinder für das Schulgebäudes geht weiter. Am Nachmittag machte ich mich bei strömendem Regen auf die Suche nach glatten Eisenstangen Stärke 6. Ich habe in der ganzen Gemeinde Zê danach gesucht, konnte das Material aber nicht finden. Ich habe es in Abomey-Calavi bekommen. Die nächste Schwierigkeit war, ein Dreirad-Motorrad für den Transport der Eisen und Wellbleche zu finden, da es die ganze Zeit regnete. Schließlich konnte ich bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Material zur Grundschule Amoussenon-Tomé zurückfahren.



Donnerstag, 22. Juni 2023

Mit großem Einsatz montieren die Arbeiter die Balken auf das Dach des Gebäudes der Grundschule.



Freitag, 23. Juni 2023

Das Gebälk der Grundschule wird mit glatten Eisenstangen Stärke 6 vom Gebäude festgemacht. Am Nachmittag setzt Regen ein, daher machen die Arbeiter eine Pause. Nach dem Regen werden die Querbalken rund um das Gebälk gesetzt.

Samstag, 24. Juni 2023

Es hat den ganzen Tag geregnet. Daher konnten die Zimmerleute die Dachplatten nur auf der Hälfte des Gebäudes anbringen. Ich verließ die Baustelle und ging im Regen nach Hause.

ontag, 26. Juni 2023

Das Gebäude der Grundschule ist vollständig mit farbigen Dachplatten bedeckt, was ein schönes Bild ist. Danach begannen die Arbeiter gleich mit großem Einsatz, das Gebälk des Toilettenblocks zu errichten und anschließend die Wellbleche zu montieren. Die Zimmerleute sind über den erfolgreichen Abschluss ihrer Arbeit froh und haben ihre Familien telefonisch darüber informiert, dass sie jetzt zurückkommen werden.





Berichterstatter: Joseph LOKO
