

## **1ERE PARTIE DU JOURNAL DU PROJET**

### **DE CONSTRUCTION DE 1 MODULE DE 3 SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU MAGASIN EN TUILES ET HUIT CABINES DE TOILETTES A L'EPP AMOUSSENON-TOMÉ DANS LA COMMUNE DE ZE**

#### **Mardi 28 mars 2023**

AG à Amoussenon-Tomé à 15h.

La population s'est fait représenter par le chef village, le directeur, les membres de l'APE. La lecture du contrat a été fait. Les conditions mentionnées dans le contrat ont été votées favorablement. Une descente sur le terrain a été faites. Le magasin pour stocker les matériaux a été apprêté ainsi que le local pour loger les ouvriers.

#### **Mercredi 29 mars 2023**

Aujourd'hui, nous avons acheté des planches, petits tecks. Ensuite le levé topographique pour le nouveau bâtiment a été fait pour prendre la base par rapport à l'ancien bâtiment. Enfin l'implantation du bâtiment a été fait.

#### **Jeudi 30 mars 2023**

Des hommes du village ont démarré la fouille du bâtiment. Le chef du village a été de passage pour stimuler les gens au travail.



#### **Vendredi 31 mars 2023**

J'ai réceptionné du sable lagunaire sur le chantier. Le ciment a été aussi convoyés sur le chantier. La fouille du bâtiment continue.

#### **Samedi 1er avril 2023**

La fabrication des briques de fondation a démarré. Après une pluie qui a freiné le travail, les briquetiers ont pu fabriquer 2 tonnes et demie de briques de fondation.

Il faut noter que la construction du château d'eau réalisée par l'ONG AS dans les mois précédents a favorisé la fourniture d'eau sur le chantier.

### **Lundi 3 avril 2023**

Dans cette journée, les maçons ont fabriquer 2 tonnes de briques de 15 pleins pour la fondation du bâtiment de l'EPP Amoussenon-Tomé.

La fouille du bâtiment évolue lentement du côté de la population.

### **Mardi 4 avril 2023**

Les maçons, les ferrailleurs évoluent tous dans leurs tâches. Les briquetiers ont fabriqué 2,5 tonnes de briques de 15 pleins et 2,5 tonnes de briques de 15 creux.

### **Mercredi 5 avril 2023**

Tous les ouvriers sont au travail depuis le matin. Le ferrailleur a démarré la à fabriquer des semelles du bâtiment. Cette journée les briquetiers ont fabriquer 1 tonne de briques de 15 pleins et 3 tonnes de briques de 15 creux.



### **Jeudi 6 avril 2023**

La fouille des semelles du bâtiment est en train d'être réalisée. Concernant la fourniture permanente d'eau, ce problème est réglé parce que nous utilisons directement l'eau du forage. Seulement nous sommes confrontés au problème de transport du groupe électrogène qui devra être sur le chantier tous les jours.

### **Vendredi 7 avril 2023**

La fouille du bâtiment continue. Quelques personnes sont arrivées pour achever le travail. Les maçons continuent la fouille des semelles du bâtiment.



### **Samedi 8 avril 2023**

Tôt le matin, les femmes du village en grand nombre sont arrivées pour ramasser des briques de fondation et les disposer autour de la fouille. La fouille du bâtiment est achevée ce matin, les maçons ont ajusté la fosse et ils ont démarré la pose du béton de propreté. Le ferrailleur a démarré l'implantation des semelles et les poteaux. Vers 16 heures, une pluie torrentielle et diluvienne s'était abattue sur tout le village. Les travaux ont été suspendus.



### **Lundi 10 avril 2023**

Nous observons depuis la semaine dernière, une pénurie de sable lagunaire. J'ai informé la directrice exécutive de l'ONG. Mme. Astrid TODA était obligée de commander le sable en se référant à une autre carrière. Le béton de propreté est en train d'être posé progressivement.

### **Mardi 11 avril 2023**

Des femmes du village ramassent des briques pour les déposer à proximité du chantier. Les maçons sont toujours à l'œuvre, pour la pose du béton de propreté. Le ferrailleur fabrique l'assemblage du chaînage bas. Les poteaux du bâtiment sont en train d'être plantés par le maçon et le ferrailleur.



### **Mercredi 12 avril 2023**

Aujourd'hui à 15h30, le maçon Gérard, le président de l'ONG AS et moi-même, nous avons fait une séance avec quelques membres APE de l'école. Nous les avons sensibilisés pour que la population se mobilise en petites groupes pour travailler sur le chantier à tour de rôle. Les membres ont promis qu'à partir de demain le chantier sera bien animé. Le président de l'ONG AS a promis de passer pour faire le constat. Le maçon et l'acheteur ont le devoir d'envoyer des photos et des vidéos comme preuve.

Les maçons ont commencé par ériger les murs de la fondation du bâtiment. Après la pénurie du sable, j'ai commencé par réceptionner ce jour du sable provenant des camions 10 roues.

### **Jeudi 13 avril 2023**

À la suite de la rencontre d'hier entre le président de l'ONG AS et les membres du bureau APE, la population est fortement mobilisée ce jour pour la fouille de toilettes. Les jeunes femmes sont présentes pour ramasser des briques afin d'aider les maçons dans cette tâche de fondation du bâtiment. Le maçon, le ferrailleur et le coffreur sont à l'œuvre pour la réalisation du chaînage bas (premier chaînage du bâtiment). À la fin de cette journée, les fossés de toilettes ont atteint un mètre de profondeur. N'eût été l'intervention du président de l'ONG AS, nous n'aurions pas réalisé cet exploit aujourd'hui. Attendons les jours suivants pour confirmer la mise en œuvre de l'engagement de la population d'Amoussenon-Tomé.

Bravo ! au président de l'ONG AS.

Bravo ! à la population qui a montré sa responsabilité.



### **Vendredi 14 avril 2023**

La fouille des toilettes continue. J'ai réceptionné du fer sur le chantier. Le reste du chaînage bas est coffré ; pendant que le coulage en béton se fait, certains murs au-dessus du chaînage bas s'érigent.

### **Samedi 15 avril 2023**

Les murs au-dessus du chaînage bas sont érigé sur les longueurs du bâtiment. Le ferrailleur est en train de poser l'assemblage du chaînage sous fenêtres (c'est-à-dire le deuxième chaînage). Dans la journée, des briques de 15 creux ont été fabriqué par le maçon.



### **Lundi 17 avril 2023**

Le chaînage intermédiaire est coulé en béton.

NB : il faut noter que la population s'absente depuis le samedi dernier et c'est dommage.

### **Mardi 18 avril 2023**

Les poteaux de la véranda sont en train d'être plantés et rallongés par le ferrailleur. Le coffreur est en train de serrer les moules métalliques dans lesquels sont implantés les poteaux. L'élévation des murs du bâtiment continue.



NB : depuis la semaine dernière, le ciment a augmenté de prix. J'effectue une longue distance pour en procurer et c'est un peu pénible pour moi.

### **Mercredi 19 avril 2023**

Ce matin, des femmes du village sont arrivées sur le chantier pour ramasser des briques et démarrer le remblayage de la véranda devant une salle de classe. Le coffreur a fini de serrer les moules pour les poteaux de la véranda. Ceux-ci sont coulés en béton. D'autres poteaux du bâtiment sont coulés en béton. La forte pluie de cette journée a fait effondrer le petit mur situé à l'arrière du bâtiment vers le château. Ce mur est rapidement reconstruit après la pluie torrentielle.

#### **Jeudi 20 avril 2023**

Nous sommes allés acheter des planches pour les convoyer à la scierie pour le chaînage de haut (ou chaînage porte et fenêtre). Comme l'électricité n'étant pas disponible toute la journée à la scierie, le coffreur n'a pas pu coffrer tout le chaînage de haut. Les maçons ont évolué dans leurs tâches de coulage en béton des poteaux qui restent.

#### **Lundi 24 avril 2023**

Le chaînage de haut avait été entièrement coffré le vendredi dernier et coulé en béton le même jour. Aujourd'hui quelques parties sont décoffrées.

#### **Mardi 25 avril 2023**

Le mur après le chaînage de haut est en train d'être érigé. Le ferrailleur est en train de poser l'assemblage de chaînage sous toit sur ce mur ayant 4 poses de briques.

#### **Mercredi 26 avril 2023**

Le mur au-dessus du chaînage haut continu. Un autre côté du bâtiment est fait.

#### **Jeudi 27 avril 2023**

Les poteaux sont rallongés par le ferrailleur. Certains chaînages sont posés puis coffrés. Presque tous les murs au-dessus du chaînage haut sont montés.

#### **Vendredi 28 avril 2023**

Tous les murs au-dessus du chaînage haut sont montés. Le coffrage du chaînage sous toit se fait. Certains poteaux sont coffrés.



### **Samedi 29 avril 2023**

Le chaînage est coffré puis coulé en béton, ainsi que certains poteaux.

### **Lundi 1er mai 2023**

Ici à l'EPP Amoussenon-Tomé, les pignons sont montés sur 4 côtés. Une forte pluie s'est abattue sur le village et a ralenti un peu les travaux, lorsque le 5e côté des pignons est en train d'être monté.

### **Mardi 2 mai 2023**

La population a continué la fouille des toilettes. Les marches du bâtiment sont montées.

### **Mercredi 3 mai 2023**

Tous les pignons du bâtiment sont définitivement montés. Des poteaux au niveau des pignons sont en train d'être coulés en béton. La population a cherché des spécialistes pour continuer la fouille des toilettes qui a atteint ce jour 2,60 m de profondeur. Le ferrailleur a construit des assemblages de fer pour soutenir de part et d'autre les marches.



### **Jeudi 4 mai 2023**

La fouille des toilettes n'a plus progresser ce jour. Le président, la directrice exécutive et certains membres de l'ONG étaient arrivés visiter le chantier et pour parler d'autres projets concernant l'école.

NB : Mme Sandie Brayard qui était arrivé pour la formation bureautique des membres de l'ONG, a rendu visite au chantier dans la soirée.

### **Vendredi 5 mai 2023**

Des femmes sont venues ramasser des briques pour les mettre à côté du bâtiment. Ces briques serviront à construire la rampe.

### **Samedi 6 mai 2023**

La construction de la rampe de l'EPP Amoussenon-Tomé a démarré. Les hommes qui doivent creuser les fosses pour les toilettes ne sont plus arrivés. Les aides-maçons ne viennent plus



### **Lundi 8 mai 2023**

Le chaînage de la rampe est placé. Le coffrage de tout le chaînage est en train d'être réalisé. Des marches sont coulées en béton.

### **Mardi 9 mai 2023**

D'autres marches sont coulées en béton. Celles exécutées hier sont décoffrées. Les pots de fleurs sont en train d'être construits. Des femmes sont arrivées pour le remblayage des marches après le passage de la directrice de l'ONG AS sur le chantier.



### **Mercredi 10 mai au mardi 16 mai 2023**

Des ouvriers de l'ONG sont sollicités pour d'autres projets ici à Amoussenon-Tomé.

### **Mercredi 17 mai 2023**

J'ai réceptionné des tuiles en couleur sur le chantier. Au premier voyage, la camionnette a pu transporter 200 tuiles et au second voyage 180 tuiles. Donc au total, j'ai réceptionné 380 tuiles dont 9 sont en très mauvais état, qui seront remplacés le lendemain.



### **Jeudi 18 mai 2023**

La population est présente ce matin pour le remblayage. La véranda est remblayée. La fouille de toilettes a presque atteint 3 m de profondeur. Les femmes ont profité pour remblayer un peu une salle de classe.



### **Du jeudi 18 au lundi 29 mai 2023**

Les ouvriers ont été sollicités pour d'autres projets de l'ONG AS ici à Amoussenon-Tomé.

### **Mardi 30 mai 2023**

Malgré l'intervention du président de l'ONG AS qui a essayé de conscientiser la population à assumer ses devoirs, celle-ci a décidé de s'arrêter à 4 m de profondeur pour les toilettes. Cela n'a pas du tout été facile pour cette population paresseuse d'atteindre cette profondeur. C'était comme une corvée pour elle.

### **Mercredi 31 mai 2023**

Ce matin, le maçon a débuté la pose de béton de propreté des toilettes. Les semelles et les poteaux en fer sont implantés.



### **Jeudi 1er juin 2023**

Les murs des toilettes sont érigés jusqu'à 6 poses de briques de 15 pleins

### **Vendredi 2 juin 2023**

Le premier chaînage est posé, coffré puis coulé en béton au-dessus du mur de 6 poses de briques au niveau des toilettes.



### **Samedi 3 juin 2023**

Les maçons sont en train d'ériger le second niveau de mur, au-dessus du premier chaînage des toilettes. Une forte pluie a mis aux arrêts les travaux de 12h à 14h. Après la pluie, le mur de 6 poses de briques au-dessus du premier chaînage des toilettes est totalement construit. Par ailleurs, j'ai commencé par réceptionner du sable de remplissage, 3 voyages sont livrés.


NB : il faut signaler aussi que la population ne participe plus au remblayage, et ne fournit plus d'aide depuis le démarrage de la construction des toilettes.

### **Lundi 5 juin 2023**

Le deuxième chaînage est posé, coffré puis coulé en béton.

### **Mardi 6 juin 2023**

Le mur après le deuxième chaînage des toilettes est en construction. De 14h30 jusqu'au-delà de 18h, une pluie a fait arrêter les travaux.

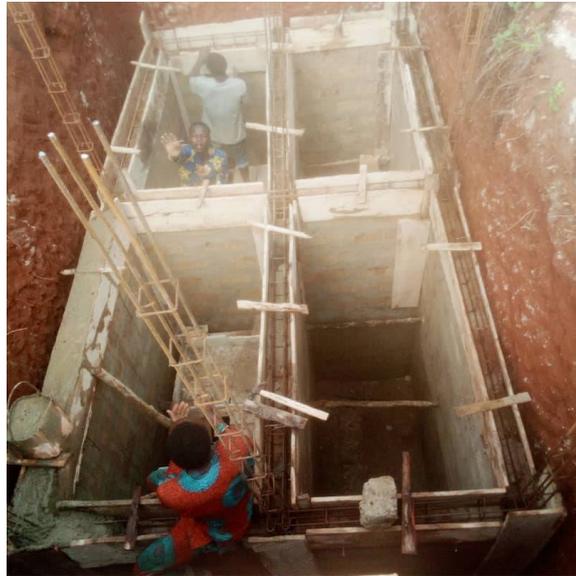

### **Mercredi 7 juin 2023**

Le mur avant 3e chaînage des toilettes est construit. Le troisième chaînage au-dessus est posé. Il faut laisser sécher le mur avant de coffrer le chaînage.



### **Jeudi 8 juin 2023**

Le troisième chaînage de toilettes est coffré est coulé avec les étriers de la dalle pour les toilettes. Ensuite le crépissage interne des toilettes a démarré avec du Sikalite et du Sikalatex.



### **Vendredi 9 juin 2023**

Sur les quatre compartiments de la fosse, 2 sont crépis du bas vers le haut. Quant au remblayage du bâtiment, la directrice de l'ONG AS était obligée d'employer une équipe pour effectuer le travail car la population a cessé de jouer sa partition.




### **Samedi 10 juin 2023**

Les deux compartiments qui restaient pour la fosse aux toilettes sont crépis. Le cimentage au-dessus des toilettes est totalement fait.

### **Lundi 12 juin 2023**

L'équipe de remblai employée par la directrice exécutive de l'ONG AS est en train de faire le remblayage restant ici à l'EPP Amoussénon-Tomé. Le ferrailleur a conçu l'assemblage de fer pour la dalle des toilettes. Ensuite, la dalle est coffrée puis coulée en béton.

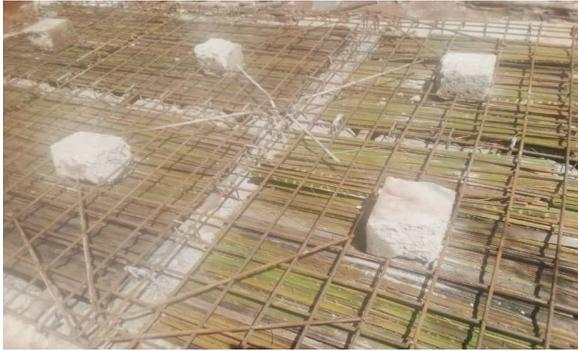

### **Mardi 13 juin 2023**

Les murs de 8 cabines de toilettes sont érigés jusqu'au niveau du chaînage sur portes.



### **Mercredi 14 juin 2023**

Le chaînage et le coffrage au-dessus des portes sont réalisés par le ferrailleur et le coffreur. Cela étant, le maçon a procédé au coulage en béton.

### **Jeudi 15 juin 2023**

Les pignons du bloc toilettes sont montés. Le béton de propreté des marches pour les toilettes est en train d'être fait. Un côté du bloc de toilettes est réalisé. Le béton de propreté du second côté des marches est entamé, quand une forte pluie a arrêté les travaux.



NB : j'ai réceptionné les portes, fenêtres et les grilles fenêtres pour le bâtiment et le bloc toilettes, ainsi que les cales fenêtres. La pluie a continué jusqu'à la tombée de la nuit.

### **Vendredi 16 juin 2023**

Le maçon a démarré les poses et serrage des fenêtres du bâtiment.

### **Samedi 17 juin 2023**

J'ai réceptionné les antivols du bâtiment.

### **Lundi 19 juin 2023**

Dans cette journée, la pluie a freiné le déroulement des travaux.

### **Mardi 20 juin 2023**

Le charpentier est arrivé. Les fermes du bâtiment sont en train d'être montées.



### **Mercredi 21 juin 2023**

Le montage des fermes pour la charpente du bâtiment de l'EPP continue. Dans l'après-midi, sous la pluie qui tombe, je suis allé à la recherche des fers de 6 lisses. J'ai parcouru toute la commune de Zê, et je n'ai pas trouvé ce matériau. J'étais obligé d'aller dans la commune d'Abomey-Calavi pour en procurer. La prochaine difficulté était de trouver un tricycle pour le transport de fers de 6 lisses et les tôles, car il pleuvait sans arrêt. Finalement, j'ai pu retourner sur le chantier de l'EPP Amoussenon-Tomé avec les matériaux à la tombée de la nuit.



### **Jeudi 22 juin 2023**

Avec enthousiasme les ouvriers montent les chevrons sur les fermes assemblées du bâtiment de l'EPP.



### **Vendredi 23 juin 2023**

La charpente est en train d'être scellée avec les fers de 6 lisses. Dans l'après-midi, la pluie tombe et les ouvriers observent une pause. Après la pluie, les lambrequins sont montés sur le périmètre de la charpente du bâtiment de l'EPP.

### **Samedi 24 juin 2023**

Il a plu toute la journée. Les charpentiers ont seulement monté les tuiles sur la moitié du bâtiment. J'ai quitté le chantier pour me rendre chez moi sous la pluie

### **Lundi 26 juin 2023**

Le bâtiment de l'EPP est entièrement recouvert de tuiles colorés qui donnent une belle image de l'infrastructure. Aussitôt, les ouvriers ont commencé avec ardeur la pose de la charpente du bloc toilettes. Ensuite, il y a eu le montage des tôles. Les charpentiers sont très heureux de terminer leur travail et ils sont prêts à rejoindre leurs familles respectives





**Rapporteur : Joseph LOKO**
