

Journal de la construction de deux modules de quartes salles de classes chacun au CEG ADJAGBO par l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » en collaboration avec ses partenaires

Lundi 25 septembre 2023

Vers 09 h au CEG ADJAGBO la Directrice de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » avec ses collaborateurs et avec ses techniciens ont procédé à l'implantation des deux bâtiments en présence de quelques responsables du CEG tel que la directrice, le directeur, le surveillant, le comptable et quelques enseignants. Aussi les représentants de la population sont là et le travail s'est déroulé correctement sur les lieux.



Mardi 26 septembre 2023

Dans la journée j'ai réceptionné des matériaux comme du sable et des planches. Les membres de l'APE sont en réunion avec la population pour décider comment les travaux des fouilles des bâtiments se dérouleront.

Mercredi 27 et 28 septembre 2023

Des voyages du sable marin continu de venir sur le chantier et j'ai réceptionné 40 tonnes de ciments.

Nouvelle réunion avec les membres de la direction du CEG, membres de l'APE et la population pour définir les équipes en charge des fouilles des bâtiments et des toilettes.



Vendredi 29 septembre 2023

Des équipes des jeunes de la population ont démarré les fouilles des deux bâtiments en même temps.



Samedi 30 septembre 2023

Les fouilles des deux bâtiments évoluent très bien et la fabrication des briques plein de 15 a commencé.



Dimanche 1 octobre 2023

Les équipes en charge des fouilles des deux bâtiments sont sur le chantier en train de travailler, et ça évolue très bien les deux côtés.



Lundi 2 octobre 2023

Les travaux de la fouille des deux bâtiments évoluent très bien sur le chantier.

Mardi 3 octobre 2023

Les travaux des ferraillements ont commencé sur le chantier et l'équipes en charge des fouilles des bâtiments sont à l'œuvre. Tout va bien.



Mercredi 4 octobre 2023

Les ferrailleurs sont en train de préparer les faillasses, les semelles, et les poteaux pour la fondation des bâtiments. Les équipes pour creuser les fouilles sont à l'œuvre. Les travaux évoluent très bien.



Jeudi 5 octobre 2023

Les travaux évoluent très bien. La fouille du bâtiment 1 est terminée. L'équipe qui travaille dans les tranches du second bâtiment, fait tous les efforts pour rattraper.

Vendredi 6 octobre 2023

Le chef maçon du bâtiment 1, Mr Gérard, a commencé de mettre le niveau dans les fouilles afin que le béton de propreté puisse être versé dedans. Au bâtiment 2 l'équipe de la population travaille fortement dans les fouilles. Les ferrailleurs aussi sont en train d'apprêter les semelles, les faillasses et les poteaux.

Samedi 7 octobre 2023

Le chef maçon du bâtiment 1 et ses collaborateurs ont commencé de mettre la première couche du béton de propreté dans les fouilles. La fouilles du bâtiment 2 évoluent bien et le président de l'APE est de passage sur le chantier pour voir l'évolution des fouilles des bâtiments.



Lundi 9 octobre 2023

La première couche de béton du bâtiment 1 est achevée. En suite les ferrailleurs ont placé les faillasses, les semelles et les maçons ont commencé d'aligner les poteaux du bâtiment. Aussitôt la fouille du bâtiment 2 est achevée, Mr Bruno et ses collaborateurs ont commencé de niveller les fouilles. L'équipe de la population en charge des fouilles a se dirigée vers l'endroit choisi pour les toilettes et a démarré en même temps les travaux pour les toilettes.



Mardi 10 octobre 2023

Très tôt ce matin le chef maçon Mr Bruno du bâtiment 2 et ses collaborateurs ont mis du béton de propreté dans les fouilles. L'équipe du bâtiment 1 a terminé l'alignement des poteaux.



Mercredi 11 octobre 2023

Très tôt ce matin l'équipe du bâtiment 2 a aligné tous les poteaux du bâtiment 2 après la pose des faillasses et des semelles par les ferrailleurs.

NB : Les deux bâtiments sont au même niveau d'exécution et nous attendons la direction technique (DST) de la mairie d'Abomey-Calavi pour le contrôle avant de continuer les travaux en béton armé.

Jeudi 12 octobre 2023

Ce jour nous avons eu la visite d'un agent de la DST au nom de Mme Jérôme AGOSSOU pour le contrôle du chantier. Mr Benoît D. AHLONSOU, le président de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE », est aussi venu sur le chantier pour voir l'évolution des travaux de la construction. Il est accompagné d'une volontaire qui a pour nom Mlle Marjorie BONNET.

NB : L'appréciation de l'agent de la DST se trouve dans le cahier du chantier.





Vendredi 13 octobre 2023

Les maçons des deux équipes ont coulés du béton armé d'une épaisseur de 30cm sur les faillances, les semelles et les poteaux. Mr Armand AGOSSA, le Trésorier de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE », est venu sur le chantier pour voir l'évolution des travaux.



DU 14 au 18 octobre 2023

Le chantier Adjagbo est mis en pause pour donner du temps de terminer le chantier de l'EPP d'Agonmey d'abord.

Jeudi 19 octobre 2023

L'équipe du bâtiment 1 a commencé l'élévation des murs de la fondation. Le plombier a conduit l'eau au niveau du château d'eau vers l'endroit choisi pour les toilettes. Vers 18 h la directrice de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » a visité le chantier pour le contrôle des travaux et elle a donner des consignes fermes à ses collaborateurs et aussi aux ouvriers pour la bonne marche des travaux.



Vendredi 20 octobre 2023

Bâtiment 1 : l'élévation des murs de la fondation évoluent très bien. Les ferrailleurs ont posé des fers sur les murs pour un chaînage intermédiaire dans la fondation d'une salle de classe recommandée par la directrice de l'ONG Actions de Solidarité lors de sa visite sur le chantier hier. Donc ça sera coulé avant le complément des murs restant pour le chaînage de bas.



Samedi 21 octobre 2023

Bâtiment 1 : l'élévation des murs de fondation de 3 salles de classes est achevée. Le chaînage intermédiaire de la 4eme salles de classes est coulé, et les ferrailleurs ont monté les fers sur les murs des 3 salles de classes pour le chaînage de bas.



Dimanche 22 octobre 2023

Bâtiment 1 : Les briques sont montées sur le chaînage intermédiaire de la 4eme salles. Les coffreurs ont commencé de coffrer le chaînage de bas sur des autres salles de classes.



Lundi 23 octobre 2023

Bâtiment 1 : Une partie du chaînage de bas est coulé et sera terminé demain. L'électricien Mr Jean SOVI est venu pour monter le câble de terre pour le bâtiment.



Bâtiment 2 : L'élévation des murs de la fondation a commencé. La directrice de l'ONG Actions de Solidarité est arrivée sur le chantier pour constater l'évolution des travaux de la construction des salles de classes et des toilettes. Elle a échangée avec Mme la directrice du CEG sur plusieurs choses au niveau des toilettes.



Mardi 24 octobre 2023

Bâtiment 1 : L'élévation des murs sur le chaînage de bas a commencé jusqu'au niveau fenêtres par endroits et à 8 poses par d'autres endroits et le reste du chaînage de bas est coulé. Après le chaînage sous fenêtres est coulé.





Bâtiment 2 : L'élévation des murs de la fondation se poursuivent très bien, et les ferrailleurs ont monté les fers du chaînage de bas sur quelques endroits. Le coffreur a réalisé les coffrages, mais rien est encore coulé. Le câbles de terre du bâtiment 2 est placé par l'électricien Mr Roméo Loukibou.



Mercredi 25 octobre 2023

Bâtiment 1 : Les murs de quelques endroits sont au niveau chaînage de haut, quelques poteaux sont montés et couler

Bâtiment 2 L'élévation des murs de la fondation sont terminé les des fers de chaînage bas sont fait, le coffrage est fait, les maçons ont coulé et ça reste quelque endroit à couler demain.



Jeudi 26 Octobre 2023

Bâtiment 1 : Les restes des mures sont élevée jusqu'au niveau chaînage haut et aussi les poteaux restant sont coulés

Bâtiment 2 : L'élévation des murs jusqu'à niveau fenêtre et les autres endroits sont monté jusqu'au huitième pose. Les ferrailleurs ont monté les fers sur les murs niveau fenêtres pour le coulage du chaînage sous fenêtre et aussi les restes des chaînage bas est coulé.



Vendredi 27 octobre 2023

Bâtiment 1 : Les poteaux dans le bâtiment sont coulés. Les coffreurs sont en train de monter les fonds fenêtres, portes, et véranda.

Bâtiment 2 : Le 2ème chaînage est coffré et est coulé. Des murs sont en train d'être érigés jusqu'au chaînage haut. Quelques poteaux de la véranda sont coffrés.



Samedi 28 octobre 2023

Bâtiment 1 : Les ferrailleurs ont posé les fers pour le chaînage haut, les coffreurs ont coffrés et les maçons ont coulés le chaînage haut en un seul bloc.

Bâtiment 2 : Les restes des murs sont montés jusqu'au niveau chaînage haut, quelques poteaux dans le bâtiment sont coulés et quelques poteaux niveau véranda sont coulés aussi.



Lundi 30 octobre 2023

Bâtiment 1 : Le chaînage haut sont décoffrés, les maçons ont commencé par monter les 4 poses de briques sur le chaînage haut pour que le 4<sup>ème</sup> chaînage avant les pignons soient réalisés.

Bâtiment 2 : Coffrages des poteaux dans le bâtiment est fait et ils sont en train d'être coulés. Les fonds des fenêtres, des portes, les chandelles au niveau du véranda et les fers sont montés pour la préparation du chaînage haut et aussi quelques parts d'entrée à la salle de classe sont en train d'être réalisés.



Mardi 31 octobre 2023

Au bâtiment 2, le 3<sup>ème</sup> chaînage est monté, coffré, puis est coulé en un seule pièce. Les pots de fleurs et les marches de ce bâtiment sont en construction.



Mercredi 1 novembre 2023

Bâtiment 1 : Les fers sont montés sur les 4 poses de briques pour la 4<sup>ème</sup> chaînage avant les pignons, coffrage niveau pignons est coffré et coulé.

Bâtiment 2 : L'élévation des murs 4 poses sur le chaînage haut sont fait pour 3 salles de classes par les maçons.

Au niveau de la toilettes l'équipe en charge de la fouille a repris les travaux.



Jeudi 2 novembre 2023

Bâtiment 1 : les restes du coulage de la 4<sup>e</sup> chaînage sont coulé et 4 pignons sur 5 sont réalisé par les maçons.

Bâtiment 2 : Le 4<sup>ème</sup> chaînage est coulé et quelques marches d'entrée des salles de classes sont réalisé. Mme Jérôme AGOSSOU de la direction des service technique (DST) de la mairie d'Abomey-Calavi, le président de notre l'ONG Mr Benoit D AHLONSOU et la directrice exécutive de l'ONG Mme Astride TODA, ont visité le chantier pour voir l'évolution des travaux.



Vendredi 3 novembre 2023

Bâtiment 1 : les pignons sont terminé, les deux poses de briques sur le 4<sup>ème</sup> chaînage derrière le bâtiment et les 3 poses de briques devant le bâtiment sont érigé.

Bâtiment 2 : Les 5 pignons du bâtiment sont réalisé et le reste du coulage du 4<sup>ème</sup> chaînage est coulé. Quelques enseignants du CEG ont apprécié la qualité des bâtiments sur tout Mme la directrice de l'établissement.



Samedi 4 novembre 2023

Bâtiment 1 : Les deux poses de briques et les trois poses après le 4<sup>ème</sup> chaînage est terminé, les parts d'entrée des salles de classes sont entrain d'être coulé et les poteaux dans les pignons sont coulé, et la rampe pour faciliter l'accès aux salles de classes aux personnes handicapées est réalisé.

Bâtiment 2 : Les poses de 2, et de 3 sur le 4<sup>ème</sup> chaînage est terminé, coffrage des poteaux dans les pillons est fait et aussi la fouille de la rampe pour des personnes handicapées est en train d'être fait.

NB Une réjouissance (fête des pignons) est organisé par Mme la Directrice de notre ONG accompagné de Mr le Président du Conseil d'Administration (PCA) et le trésorier de l'ONG à l'intention des ouvriers de l'ONG.



Lundi 6 novembre 2023

Bâtiment 1 : Le chaînage de la rampe est en train d'être coulé, les parts de marches d'entrée à la salle sont en train d'être coulé, et aussi quelques poteaux des pots de fleurs.

Bâtiment 2 : La fouille de la rampe des handicapés est en train d'être creuser, et quelques parts des marches d'entrée dans la salle sont en train d'être coffré.



Mardi 7 novembre 2023

Bâtiment 1 : Des marches d'entrée dans les salles de classe sont en train d'être coulé.

Bâtiment 2 : Les murs de la fondation de la rampe sont en train d'être réalisé, quelques poteaux coffrés dans les pignons sont en train d'être coulé.

Au niveau des toilettes quelques tonnes de briques pleins de 15 sont fabriquées pour les travaux.



Mercredi 8 novembre 2023

Bâtiment 1 : Les poteaux restants dans les pignons, et des marches d'entrée dans les salles de classes sont coulés.

Bâtiment 2 : Le chaînage sur les murs de la fondation de la rampe sont en train d'être coulé.

Au niveau des toilettes, la fabrication des briques plein de 15 et creux de 12 se poursuivent et les jeunes en charge de la fouille sont en train d'évoluer pour vite terminer la fouille.



Jeudi 9 novembre 2023

Bâtiment 1 : Les poteaux dans les angles du bâtiment sont en train d'être coulés, les restes des marches d'entrée dans les salles de classes et les poteaux dans les pots de fleurs sont en train d'être coulés.

Bâtiment 2 : Les poteaux coffrés dans les pignons du bâtiment, les poteaux dans les pots de fleurs et le reste du chaînage de la rampe sont coulés.



Vendredi 10 novembre 2023

Les coffreurs sont en train de décoffrer les poteaux coulés dans les pignons et dans les angles des deux bâtiments et dans les pots des fleurs.


Au niveau des toilettes les briques creux de 12 sont fabriqués.



### Samedi 11 novembre 2023

Pour le bâtiment 1 et 2, les coffreurs continuent de décoffrer les poteaux et les fonds fenêtres. Ils profitent pour ranger les planches dans le magasin.

S'agissant des toilettes, la fosse a atteint 4,30 m, 4,70 m, 4,80 m de profondeurs par endroits. Nous avons pu échanger avec les membres de l'APE a la présence de Mr KAMADE et ils ont promis d'achever la fouille au plus tard le lundi prochain. Nous envisageons au moins 6 mètres de profondeurs.

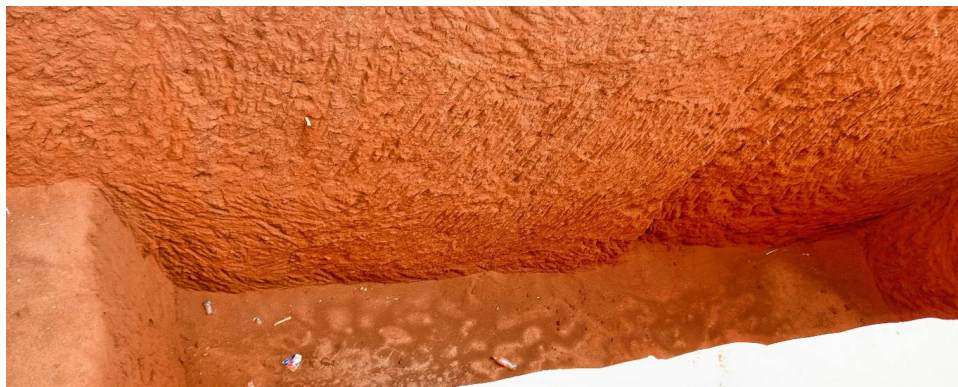

### Lundi 13 novembre 2023

Les planches et l'assemblages des fers ont été rangés.

Le restes des matériaux est rangé et stocké au magasin du CEG. Sur ordre de la directrice exécutive de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITE pour la profondeur de la fouille des toilettes, nous attendons que ça atteigne au moins 6 mètres.

### Mercredi 15 novembre 2023 au Mardi 21 novembre 2023

Les travaux sur le chantier ont connu un peu de difficulté au niveau de la population qui n'a pas encore achevé les fouilles de toilette.

### Mercredi 22 novembre 2023

La direction des services technique de la mairie d'Ab-Calavi représentée par Mme AGOSSOU Jérôme est arrivé sur le chantier pour voir l'évolution des travaux.

### Jeudi 23 novembre au 5 décembre 2023

La population représentée par quelques jeunes en charge des fouilles de toilettes a achevé une fouille. La seconde sera achevé dans les jours avenir.

### Mercredi 6 décembre 2023

Les maçons sont en train de mètre a niveau le trou de la toilette 1 pour le béton de propreté et pour la seconde fouille les jeunes en charge sont à l'œuvre pour achever.

### Jeudi 7 décembre 2023

Pour la toilette 1 : les ferrailleurs ont posé les fers, faillasses, semelles, et les poteaux et les maçons ont coulés le béton armé pour la fondation.



Pour la toilette 2 : la fouille est environs à 5 mètres de profondeur.

Vendredi 8 décembre 2023

Toilette 1 : les maçons ont monté les briques dans la fosse.



Samedi 9 décembre 2023

Toilette 1 : pour le 1<sup>er</sup> chaînage : les fers sont posés, le chaînage est coffré et coulé.

Toilette 2 : béton propreté est fait, les fers faillasse, semelles, les poteaux sont posés et les maçons ont coulé la fondation en béton armé.



### Lundi 11 décembre 2023

Toilette 1 : les maçons ont élevé les briques au niveau 2<sup>ème</sup> chainage dans la fosse.

Toilette 2 : les maçons ont élevé les briques au niveau 1<sup>er</sup> chainage dans la fosse.

### Mardi 12 décembre 2023

Toilette 1 : les fers sont posés, coffré et coulé (2<sup>ème</sup> chainage dans la fosse)

Toilette 2 : les fers sont posés, coffré, et le 1<sup>er</sup> chainage est coulé dans la fosse de la toilette et vers 16 heures, les maçons ont élevé les briques sur le 1<sup>er</sup> chainage jusqu'au niveau 2<sup>ème</sup> chainage.



### Mercredi 13 décembre 2023

Toilette 1 : les briques sont élevés au niveau 3<sup>ème</sup> chainage.

Toilette 2 : les fers sont posés, coffré, et 2<sup>ème</sup> chainage est coulé.



Jeudi 14 décembre 2023

Toilette 1 : Après la fosse est crépi à l'intérieur avec de sikalite et sikalatex, les coffreurs préparent la dalle pour fermer la fosse.

Toilette 2 : les fers sont posés, coffré et le 3ème chainage est coulé.



Vendredi 15 décembre 2023

Toilette 1 : les ferrailleurs ont apprêté la dalle, coffré et coulé.

Toilette 2 : les coffreurs sont en train de préparer la dalle de la toilette.





Samedi 16 décembre 2023

Toilette 1 : l'élévation des briques a commencé sur la dalle.

Toilette 2 : les coffreurs sont en train d'apprêter la dalle pour fermer la fosse.



Lundi 18 décembre 2023

Toilette 1 : les murs des cabines de la toilettes sont monté au niveau chainage haut.

Toilette 2 : les ferrailleurs sont en train de préparer la dalle.

NB : la représentante de la DST de la mairie est arrivée sur le chantier pour le contrôle des travaux et voir l'évolution du chantier.



Mardi 19 décembre 2023

Toilette 1 : Les fers sont montés sur les murs, coffré et le chaînage haut est coulé .

Toilette 2 : les ferrailleurs ont apprêté la dalle, coffré et coulé.

Bâtiment 1 : les fenêtres sont placées et serrées.

Mercredi 20 décembre 2023

Toilette 1 : les murs sont montés jusqu'au niveaux pantes.

Toilette 2 : les murs des cabines de toilettes sont érigés sur la dalle jusqu'au niveau du chaînage sous portes.

Bâtiment 1 : les portes sont ajustées, et serrées.





#### Jeudi 21 décembre 2023

Toilette 2 : les fers sont posés par les ferrailleurs, coffré par les coffreurs, et le chaînage haut est coulé en béton armé par les maçons.

Dans l'après midi la directrice de l'ONG, la directrice du CEG, le comptable et autres personnalités de l'APE ont visités le chantier pour apprécier l'évolution des travaux.

#### Vendredi 22 décembre 2023

Toilette 2 : les murs sont montés après le chaînage haut jusqu'au niveau pantes.

La population ramasse le sable de remblai située au niveau des latrines pour le convoier dans les salles des bâtiments érigés.

#### Samedi 23 décembre 2023

Toutes les deux toilettes sont aux niveaux pantes.



Du lundi 24 décembre 2023

Les jeunes engagés pour les travaux du remblayage des salles de classes sont entrains.

Mercredi 26 décembre 2023

Les travaux du remblayage des salles de classes évoluent très bien

Jeudi 27 décembre 2023

Les travaux du remblayage des salles de classes par les jeunes engagés évoluent très bien

Du 28 au 31 décembre 2023

Dans l'ensemble du chantier c'est les travaux du remblayage des salles des classes qui se font par les jeunes engagés.

Mercredi 3 janvier 2024

Les électriciens ont commencé par placer les tuyaux orange dans les murs des salles des classes et le remblayage des salles de classes continue.

Jeudi 4 janvier 2024

Les travaux des électriciens évoluent bien.



Vendredi 5 janvier 2024

Les remblayages évoluent très bien sur le chantier, les travaux des électriciens aussi et dans la soirée Mme Jérôme AGOSSOU de la DST de la mairie d'ABOMEY-CALAVI, Mme la directrice de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE », Mr le PCA de l'ONG sont venus sur le chantier, ensemble avec les membres de l'administration du CEG ont visités le chantier pour voir l'évolution des travaux.

Du 6 au 12 janvier 2024

Les jeunes engagés pour les remblayages des salles des classes ont poursuivi les travaux jusqu'à ce que les salles des classes soient remplis et terminer.



Vendredi 12 au 13 janvier 2024

Réceptions et déchargement des balcons pour les rampes des handicapés.

Mercredi 16 janvier 2024

Les tuiles pour la toiture sont livrés sur chantier et déchargés.



Jeudi 17 janvier 2024

510 feuilles de tuiles par bâtiment sont livrés.



Du Vendredi 17 au 25 janvier 2024

Les bois pour la charpente sont en train d'être traités dans les scieries



Vendredi 26 et 27 janvier 2024

Les bois sont livrés sur le chantier.



Samedi 27 janvier 2024

Mr François ALLADE, chef charpentier du bâtiment 2 avec son équipe ont commencés préparer les bois pour les fermes du bâtiment.

Lundi 29 janvier 2024

Bâtiment 1 : Mr Crépin SOVI, chef charpentier, avec son équipe sont en train d'apprêtés les bois pour réaliser les fermes dans le bâtiment.

Bâtiment 2 : Mr François ALLADE et ses collaborateurs sont en train d'apprêtés aussi les bois pour réaliser aussi des fermes dans le bâtiment.

Les maçons sont en train de monter la clôture au niveau des toilettes.



Mardi 30 janvier 2024

Bâtiment 1 : l'équipe du chef charpentier Mr Crépin SOVI ont réalisé quelques fermes dans le bâtiment.

Bâtiment 2 : l'équipe du chef charpentier Mr François ALLADE ont réalisé aussi des fermes dans le bâtiment.



Mercredi 31 janvier 2024

Bâtiment 1 : l'équipe de Mr Crépin a réalisé tous les fermes dans le bâtiment.

Bâtiment 2 : l'équipe de Mr ALLADE a fini les fermes et ils sont en train de réaliser les traverses sur les fermes.

Au niveau des toilettes les maçons ont monté la clôture jusqu'au niveau exigé.



Jeudi 1 février 2024

Bâtiment 1 : l'équipe de Mr Crépin est en train de réaliser les traverses sur les fermes.

Bâtiment 2 : l'équipe de Mr ALLADE a commencé de mettre les chevrons autour du toit

Vendredi 2 février 2024

Bâtiment 1 : Jusqu'au soir les chevrons sont placés

Bâtiment 2 : l'équipe de Mr ALLADE est entrain de placer les tuiles.



Samedi 3 février 24

Bâtiment 1 : Ici aussi l'équipe de Mr. Crépin commence à placer les tuiles.

Bâtiment 2 : le toit est achevé.

Dimanche 4 février 2024

Aussi le toit du bâtiment 1 est achevé. Félicitation à nos charpentiers.



Le toit de la toilette est aussi fait.



**Rapporteur :**  
**Jean Azombakin**
