

ゴロ・・ジグベ第一中学校のための 4教室、トイレ、および給水塔の建設 作業報告1

2022年10月17日


2022年8月2日に市長が技術部長と、財政部長とともにゴロ・ジグベ第一中学校の建設開始の確認のために御自身で来られました。学校の校長先生と親の代表者たちもいて、私達が仕事を開始するのを喜んでいました。材料置き場があてがわれ、作業員の泊まる場所も用意されていました。

翌日、最初の建材がすでに届きました。私達は基礎になる用地を紐と棒で囲い、作業する若い人たちが基礎穴掘りを開始できるようにしました。



左官達はすぐにレンガ作りを開始し、鉄筋工たちが基礎穴に敷く鉄筋をこしらえました。

8月6日には基礎穴掘りが終わりました。左官たちは穴の底を平にし、柱が立つ所を広げました。

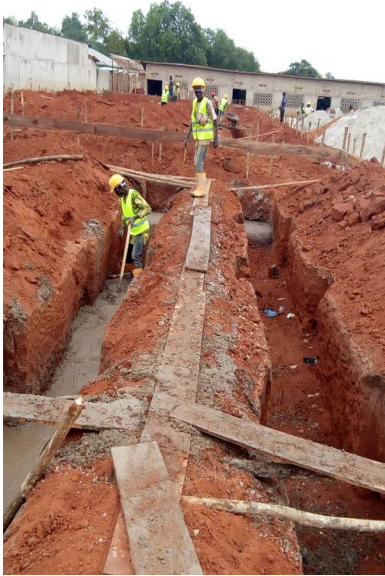

鉄筋が基礎に敷かれたところに二番目のコンクリート層が流されました。その上に基礎壁が建てられます。



電気工がアースを備え付けました。下の鉄制定着部にセメントが流されます。すると建物の壁が建って行きます。



9月3日に私達は上棟祭を行いました。地区長が、壁が乾燥する間に基礎空間を埋めるための砂を送って下さいました。中学校の生徒たちは全力でその作業に当たりました。



機械工がドアと窓枠を造り上げました。屋根板が送られてきました。



10月3日に切断された屋根材が届きました。大工たちがそれを整え、屋根作りの準備をしました。



2022年10月17日に建物は漆喰を塗るところまで出来上がりました。

このプロジェクトに拘わられたみなさま全てに御礼を申し上げます。これはきっちりした運営を必要とした大きなプロジェクトでした。建設チームと、素晴らしい作業をした購入チームに感謝します。

心よりありがとう！

當田アストリット

