

**TAGEBUCH**  
**ZUM BAU EINES GEBÄUDES MIT ZWEI KLASSENZIMMERN, BÜRO,  
LAGERRAUM UND TOILETTEN**  
**FÜR DIE ÖFFENTLICHE VORSCHULE VON KOUKOULOUNDA**  
**REGIERUNGSBEZIRK OUAKE**  
**GEMEINDE VON OUAKE**  
**REPUBLIK BENIN**

**Montag, 7. August 2023**

Gegen 9 Uhr morgens treffen sich die Mitglieder und der 1. Vorsitzenden, Herr Benoît D. AHLONSOU, des Vereins „ACTIONS DE SOLIDARITE“ mit den Mitgliedern des Elternbeirates, dem Bezirksvorsteher von Ouaké und der Bevölkerung des Dorfes Koukoulounda zu einer Generalversammlung. Nach der Begrüßung wird der Vertrag zum Bau eines Gebäudes mit zwei Klassenzimmern, Büro, Lagerraum und Toiletten mit vier Kabinen für die öffentlichen Vorschule von KOUKOULOUNDA vorgelesen. Danach werden Fragen beantwortet und schließlich über den Vertrag abgestimmt. Anschließend stellte der 1. Vorsitzende Benoît D. AHLONSOU die Techniker des Vereins „ACTIONS DE SOLIDARITE“ wie die Maurer, die Eisenbieger und die Zimmerleute vor. Der Bezirksvorsteher, die Mitglieder des Elternbeirates und die Bevölkerung zeigten gemeinsam das Gelände, auf dem das Gebäude und die Toiletten gebaut werden sollen. Diese Versammlung ist die Basis für den Beginn der Bauarbeiten. Herr Benoît D. AHLONSOU und ich, Jean AZOMBAKIN, haben im Anschluß an die Versammlung mit dem Einkauf der ersten Materialien wie Sand, Zement, Brettern, Kies, Holz, Eisen und anderem begonnen. Auf dem Baugrund erfolgt nach Eintreffen der Bretter die Installation des Schnurgerüstes durch die Techniker des Vereins.





### **Dienstag, 8. August 2023**

Sehr früh am Morgen begannen die Maurer mit der Herstellung der 15cm dicken Vollbausteine für das Fundament des Gebäudes und der Hohlbausteine für die Gebäudewände. Die Frauen des Dorfes tragen den Maurern fleißig Wasser zu. Die Männer versprachen, am nächsten Tag früh anwesend zu sein, um mit dem Ausheben der Fundamentgräben zu beginnen. Heute wäre der Markt von „KASSOUA“.



### **Mittwoch, 9. August 2023**

Wie geplant war das Männerteam gegen 8 Uhr morgens vor Ort, um mit den Aushebearbeiten zu beginnen. Die Frauen bringen ausreichend Wasser für die Arbeiten auf der Baustelle. Die Herstellung der Bausteine wird fortgesetzt und die Eisenbieger bereiten die Eiseneinlagen für das Fundament und die Pfeiler vor, damit die Arbeiten anschließend schnell voranschreiten.



### **Donnerstag, 10. August 2023**

Die Bevölkerung ist vor Ort, um die Aushebearbeiten fertigzustellen. Es werden weiter Hohlbausteine hergestellt und auch die Eisenbieger sind am Werk.



## Freitag, 11. August 2023

Gegen 8 Uhr morgens begannen die Maurer, Unebenheiten in den Fundamentgräben auszugleichen und anschließend den bewehrten Unterlagenbeton einzugießen. Die Leute aus dem Dorf sind vor Ort und haben mit dem Ausheben der Toilettengrube begonnen. Die Eisenbieger sind am Werk. Auf der Baustelle läuft alles gut.



## Samstag, 12. August 2023

Heute früh begannen die Maurer, Beton auf die Eiseneinlagen in den Fundamentgräben zu gießen. Die Bevölkerung ist vertreten: Frauen bringen Wasser auf die Baustelle und Männer heben die Toilettengrube aus. Tagsüber stellten wir fest, dass der Brunnen ausgetrocknet ist. Also verhandelten wir ein paar Meter von der Baustelle entfernt über Wasser und kauften einen Wasserschlauch sowie einige Anschlußsätze, um das Wasser mit der Baustelle zu verbinden.



## Montag, 14. August 2023

Heute früh begannen die Maurer mit der Errichtung der Fundamentmauern bis zur Höhe des unteren Eisenankers.



## Dienstag, 15. August 2023

Heute früh haben die Eisenbieger die Einlagen für den unteren Eisenanker montiert, die Zimmerleute haben die Verschalung rund um das Gebäude gemacht und die Maurer haben den Anker in einem Stück gegossen. Einige Leute aus dem Dorf kamen wegen der Toilettengrube. Andere Leute haben Termine für den nächsten Tag vereinbart, da heute wieder der Markttag von „KASSOUA“ ist.



## Mittwoch, 16. August 2023

Gegen 8 Uhr morgens begann man die Mauern bis auf Fensterniveau zu erhöhen. An der Breitseite des Gebäudes wurden 8 Bausteinreihen aufgemauert, da diese Seiten keine Fenster haben. Gegen 16 Uhr montierten die Eisenbieger die Anker unterhalb der Fensteröffnungen, die die Zimmerleute anschließend verschalteten und die Maurer dann gossen. Sie gossen auch 2 Pfeiler der Veranda. Wie erwartet war die Bevölkerung in großer Zahl anwesend, um den Maurern zu helfen (Bausteine herantragen, Toilettengrube ausheben und Wasser zur Baustelle

bringen). Dank dieser starken Präsenz der Bevölkerung sind die Arbeiten auf dem Gelände gut vorangekommen.



#### **Donnerstag, 17. August 2023**

Die Maurer errichteten die Mauern bis zum oberen Eisenanker und zwei Pfeiler an der Veranda wurden gegossen. Die Arbeiten auf der Baustelle gehen sehr gut voran, jeder trägt seinen Teil bei, Maurer, Eisenbieger, Zimmerleute und die Bevölkerung.



#### **Freitag, 18. August 2023**

Gegen 8 Uhr morgens fuhren die Maurer mit dem Aufmauern der restlichen Mauern fort. Sie gossen auch die restlichen Pfosten im Gebäude und an der Veranda, sodass alle Mauern des Gebäudes die Höhe des oberen Eisenankers erreicht hatten. Die Bevölkerung ist vor Ort, um ihren Beitrag zu leisten: Die Toilettengrube wird in einer Tiefe von etwa 4,50 Metern fertiggestellt. Damit kein Mangel an Bausteinen eintrete, werden einige Tonnen 15er Hohlbausteine angefertigt.



### **Samstag, 19. August 2023**

Heute Morgen gegen 8 Uhr haben die Eisenbieger die Eiseneinlagen für den oberen Eisenanker angebracht und die Zimmerleute sind mit der Verschalung beschäftigt, aber sie konnten nicht alles fertig machen. Das Gießen des Ankers wird daher auf morgen, Sonntagvormittag, verschoben. Um keine Zeit zu verlieren, begannen die Maurer in Zusammenarbeit mit den Eisenbiegern die Arbeit in der Toilettengrube. Für den Bau des Toilettenhäuschens werden auch 12cm dicke Hohlbausteine hergestellt.



### **Sonntag, 20. August 2023**

Gegen 8 Uhr morgens beendeten die Zimmerleute die restlichen Verschalungsarbeiten. Die Maurer gossen den Anker in einem Stück. Die Bevölkerung ist vor Ort, um ihre Rolle wahrzunehmen.





### **Montag, 21. August 2023**

Gegen 8 Uhr morgens entfernten die Zimmerleute die Verschalungen des oberen Eisenankers. Die Maurer errichteten an allen Seiten des Gebäudes zusätzliche vier Bausteinreihen. In der Toilettengrube begannen sie, die Wände bis zum 1. Anker aufzumauern. Sogar an der Rampe haben die Arbeiten begonnen. Das Helferteam des Dorfes ist anwesend. Der Tag auf der Baustelle ist sehr schön und ich gratuliere dem Dorfvorsteher und seinen Beratern, dem Vorstand des Elternbeirates und seinem Vorsitzenden für ihr Engagement an der Seite der Arbeiter seit Beginn dieses Projekts bis heute. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihnen.



## **Dienstag, 22. August 2023**

Gegen 8 Uhr morgens legen die Eisenbieger die Eisen auf die Mauern, die gestern errichtet wurden; Die Zimmerleute haben die Verschalung gefertigt und die Maurer haben den letzten Eisenanker unterhalb des Daches gegossen. Auch der Anker der Rampe ist gegossen. Die Bevölkerung wird durch einige wenige Menschen vertreten, die Wasser zur Baustelle bringen.



## **Mittwoch, 23. August 2023**

Gegen 7 Uhr setzte ein heftiger Regen ein, der bis etwa 10 Uhr anhielt. Nach diesem Regen begannen die Arbeiten auf der Baustelle. Die Zimmerleute entfernten die Verschalungen des letzten Eisenankers und die Maurer errichteten die vier Giebel des Gebäudes. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die mit der Qualität der geleisteten Arbeit zufrieden ist, gießen sie auch den erste Anker in den Toilettengrube. Gegen 11 Uhr traf der Bürgermeister von OUAKE auf der Baustelle ein, um den Fortschritt der Arbeiten zu prüfen. Der Bürgermeister ist sehr zufrieden. Er sprach über die hohe Qualität, die auf der Baustelle erreicht wird. Er nutzte auch die Gelegenheit, um den Verein „ACTIONS DE SOLIDARITE“ und der Bevölkerung von Koukoulounda zu loben. Gegen 16 Uhr traf der Bezirksvorsteher von Ouaké auf der Baustelle ein, um sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren. Er gratulierte den Arbeitern zu ihrer Dynamik bei der Arbeit und forderte seine Bevölkerung auf, auf der Baustelle anwesend zu sein, um die Arbeiter zu unterstützen, damit alles gut vorankommt.



## **Donnerstag, 24. August 2023**

Gegen 6 Uhr morgens kam der 1. Vorsitzende unseres Vereins zur Baustelle, um sich den Fortschritt der Arbeiten anzusehen. Er ist sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Arbeiter auf der Baustelle arbeiten. Anschließend sprach er mit einigen anwesenden Leuten der Bevölkerung, die auf der Baustelle halfen, ehe er seinen Weg fortsetzte. Gegen 7 Uhr begann es zu regnen. Als es gegen 9 Uhr aufhörte, begannen die Arbeiten auf der Baustelle. Am Gebäude erfolgt die Erhöhung von zwei bis drei Bausteinreihen auf dem vierten Anker, um die Öffnungen unter dem Dach zu schaffen. In der Toilettengrube wird die zweite Anker gegossen. Die Bevölkerung ist stets vor Ort, um den Arbeitern zu helfen.



## **Freitag, 25. August 2023**

Gegen 8 Uhr begannen die Arbeiten auf der Baustelle. Am Gebäude wurde gerade der Rest der Bausteinreihen auf dem vierten Anker fertiggestellt. Auch das Gießen der Pfeiler in den Giebeln und überall rund um das Gebäude erfolgt. Die Arbeiten am Gebäude sind hiermit abgeschlossen.

In der Toilettengrube erfolgt die Erhöhung der Wände über dem zweiten Anker.

Das Bauteam arbeitete fleißig, um die Betontische und -bänke für die Kinder herzustellen. Der Dorfvorsteher, der Vorsitzende des Elternbeirates und einige Älteste n von Koukoulounda sind immer vor Ort, um das Team der Bevölkerung zu unterstützen und auch viele der Schwierigkeiten zu lösen, mit denen die Arbeiter täglich konfrontiert sind. Ich gratuliere auch dem Bezirksleiter von OUAKE für sein persönliches Engagement, von Anfang an bis heute jeden Tag vor Ort zu sein.



## Sonntag, 27. August 2023

Gegen 8 Uhr legen die Eisenbieger die Eiseneinlagen für die Verschußplatte der Toilette auf und die Platte wird gegossen. Am Nachmittag gegen 16 Uhr beginnen die Maurer die Mauern des Toilettenhäuschen auf der Verschußplatte zu errichten.

Auch die Betontische und -bänke werden gegossen.



## Montag, 28. August 2023

Schon sehr früh montierten die Eisenbieger die Eiseneinlagen für den oberen Anker auf die Mauern der Toilette. Die Zimmerleute fertigten die Verschalungen und die Maurer gossen den Beton ein. Am Abend gegen 17 Uhr wurden die Mauern auf dem Anker errichtet und die Schräge für das Toilettendach fertiggestellt.



Die Tische und Bänke sind ebenso fertig.



#### **Dienstag, 29. August 2023**

Sehr früh heute Morgen sind alle Arbeiter vorübergehend abgereist. Die Wände müssen einen Monat lang trocknen, bevor das Dach gebaut werden kann. In den kommenden Tagen werden andere Arbeiter nach Koukoulounda kommen, um hier zu arbeiten.

#### **4. September bis 25. September 2023**

Während die Mauern trockneten, machte sich die Bevölkerung daran, die Klassenräume, das Büro und den Lagerraum mit Sand aufzufüllen. Auch kleine Kinder helfen mit großer Freude.





In Calavi suchten wir während dieser Zeit nach asbestfreien Eternitplatten für das Dach des Gebäudes. Am 20. September haben wir sie schließlich gefunden und gekauft.

### **Montag, 25. September 2023**

Die Eternitplatten wurden gemeinsam mit den Türen und Fensterläden nach Koukoulounda transportiert.



## **Dienstag, 26. September 2023**

Die Zimmerleute trafen auf der Baustelle von Koukoulounda ein. Sie suchten im Umfeld von Ouaké nach Ebenholzbohlen für den Dachstuhl. Nach dem Kauf wurden die Bohlen an die Maschinen transportiert, um sie zu sägen.


## **Samstag, 30. September 2023**

Die geschnittenen Bohlen wurden zur Baustelle transportiert



## **2. bis 4. Oktober 2023**

Die Zimmerleute fertigen die Querbinder des Dachstuhls.

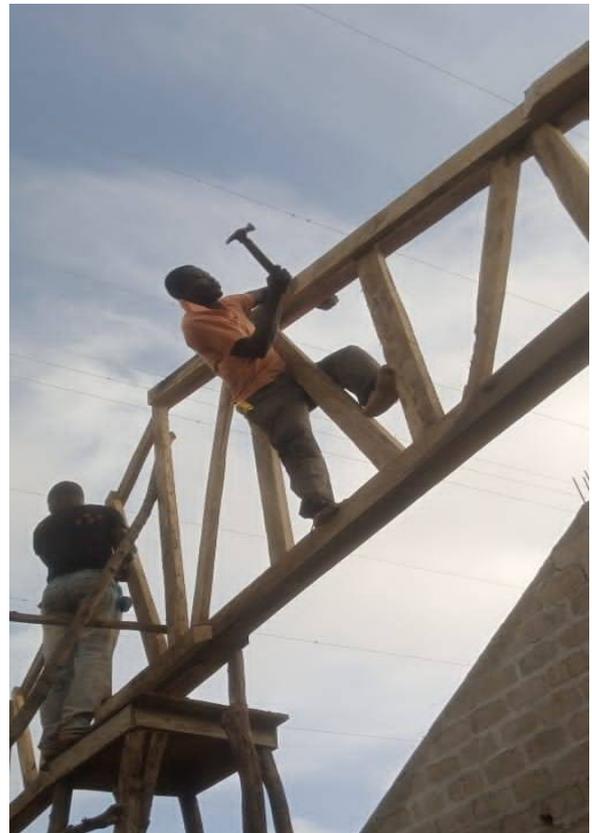

**Mittwoch, 4. Oktober 2023**

Am Ende des Tages waren alle Querbinder fertig und die Längsbalken wurden aufgelegt.



### **Freitag, 6. Oktober 2023**

Die Zimmerleute begannen die Eternitplatten an den Dachstuhl zu schrauben. Die Leute aus dem Dorfe helfen und tragen den Zimmerleuten die Platten zu.

### **Samstag, 7. Oktober 2023**

Das Dach des Gebäudes ist fertig.



### **Sonntag, 8. Oktober 2023**

Auch das Toilettenhäuschen hat sein Dach bekommen.



Berichterstatter :  
Jean Azombakin
