

JOURNAL DU CHANTIER CEG ADJAGBO suite

Mardi 06 février 2024

Bâtiment 2 : Le chef maçon Mr Bruno avec son équipe est en train de fixé les fenêtres sur le bâtiment.

Mercredi 07 février 2024

Bâtiment 1 : Le chef maçon Mr Gérard avec son équipe a commencé le crépissage de la première salle.

Bâtiment 2 : Le chef maçon Mr Bruno avec son équipe a commencé aussi le crépissage de la première salle.



Jeudi 08 février 2024

Pour les deux bâtiment les travaux du crépissage avance très bien avec les deux équipes sur le chantier dans une salle de classe chacune.





Vendredi 09 février 2024

Bâtiment 1 : les travaux du crépissage avancent très bien.

Bâtiment 2 : Les travaux du crépissage dans la 2^{ème} salle de classes avancent bien.

Nous avons réceptionné les portes des toilettes.



Samedi 10 février 2024

Bâtiment 1 : le crépissage avance bien dans la 2^{ème} salle de classes. C'est l'intérieur des salles de classes d'abord qu'ils sont en train de crépir.

Bâtiment 2 : Dans la 3^{ème} salles de classes les travaux de crépissage avancent bien.

Lundi 12 février 2024

Bâtiment 1 : Le crépissage interne de la 2^{ème} salle de classe suit son cours.

Bâtiment 2 : Le crépissage interne de la 3^{ème} salle de classe continue et aussi les travaux de finition évoluent au niveau des fenêtres.



Mardi 13 février 2024

Bâtiment 1 : Le crépissage interne de la 3^{ème} et de la 4^{ème} salle de classes 3è évoluent très bien.

Le crépissage externe côté véranda a débuté par la 3^{ème} salle.

Bâtiment 2 : Le crépissage interne de la 4^{ème} salle est lancé. Les mur externe côté fenêtres est en train d'être crépi avec du sikalite et du sikalatex, afin d'assurer une bonne étanchéité.



Mercredi 14 février 2024

Bâtiment 1 : Le crépissage interne de la 4^{ème} salle de classes continue.

Bâtiment 2 : Le crépissage externe de la véranda des 4 salle de classes est simultanément amorcé.



Jeudi 15 février 2024

Bâtiment 1 : Le crépissage externe côté véranda est réalisé.

Bâtiment 2 : Les faces aux externes des pignons sont crépies avec du sikalite et du sikalutex pour assurer une bonne étanchéité des murs.



Vendredi 16 février 2024

Bâtiment 1 : Les murs derrière du bâtiment sont crépies avec du sikalite et sikalutex pour empêcher l'humidités au temps de la pluie.

Bâtiment 2 : Les partis externes derrière du bâtiment restante sont crépies avec du sikalite et du sikalutex pour empêcher dans l'avenir l'humidité de la pluie.



Samedi 17 février 2024

Bâtiment 1 : Les deux faces aux extrêmes des pignons sont crépies avec du sikalite et du sikalutex pour assurer une bonne étanchéité des murs.

Bâtiment 2 : La finition des consorts est en train d'être réalisé et aussi trois faces devant véranda sont en train d'être crépies.



Lundi 19 février 2024

Bâtiment 1 : Les huit tableaux sont réalisés.

Bâtiment 2 : Deux panneaux et trois poteaux de la véranda sont crépies.



Mardi 20 février 2024

Bâtiment 1 : Devant la véranda trois panneaux et trois poteaux sont crépies.

Bâtiment 2 : Trois panneaux et trois poteaux de la véranda sont crépies.

Au niveau des toilettes : chaque équipe a placés 7 portes.





Mercredi 21 février 2024

Bâtiment 1 : Les poteaux et les restes des panneaux du devant du véranda sont en train d'être crépiés.

Bâtiment 2 : Les panneaux du devant du véranda et les poteaux sont en train d'être crépiés. Tout évolue très bien sur le chantier.

Au niveau des toilettes : Le crépissage a démarré.

Nb Dans la soirée, le Président du conseil d'administration de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » a visité le chantier pour apprécier l'évolution des travaux.





Jeudi 22 février 2024

Bâtiment 1 : Les poteaux et les panneaux restants de la véranda sont crépiés.

Bâtiment 2 : Les maçons ont pu crépir les deux murs séparateurs de la véranda avec leurs poteaux correspondants.

Au niveau des toilettes le crépissage continue.





Vendredi 23 février 2024

Bâtiment 1 : Trois consorts sont crépis avec leurs poteaux correspondants.

Bâtiment 2 : Le cimentage est commencé dans la 4^{ème} salle de classe.



Samedi 24 février 2024

Bâtiment 1 : Les quatre salles de classes sont nivelées, apprêtées pour le cimentage.

Bâtiment 2 : Les maçons ont cimenté la 3^{ème} salle de classe.

Au niveau des toilettes le crépissage continue. Le plombier est en train de réaliser la fouille et les raccordements de la tuyauterie des douches. Mr Maxime AGBOZO de la mairie AB-Calavi a visité le chantier pour voir l'évolution des travaux.



Lundi 26 février 2024

Bâtiment 1 : La 1^{ère} salle de classe est cimentée.

Bâtiment 2 : les maçons sont en train de faire le cimentage de 3 salles sur 4

Au niveau des toilettes les travaux de crépissages continuent dans les cabines de toilettes.



Mardi 27 février 2024

Bâtiment 1 : La 2^{ème} salle de classe est cimentée.

Bâtiment 2 : La dernière selle de classe vient d'être cimentée.

Au niveau des toilettes : le crépissage interne des cabines évolue normalement, et les poteaux de la clôture du bloc de la toilette sont en train d'être coffrés pour que ils soient couler en béton.

Au niveau des rampes pour des personnes handicapés : le chef soudeur Mr Sosthène est arrivé pour l'implantation des balcons pour les deux bâtiments.



Mercredi 28 février 2024

Bâtiment 1 : la 3^{ème} salle de classe est cimentée.

Bâtiment 2 : l'équipe du chef maçon Mr Bruno sont en train de préparer le cimentage de la véranda.

Au niveau des toilettes, les travaux du crépissage évoluent très bien, et les poteaux, qui sont dans la clôture, sont coffré et couler.



Jeudi 29 février 2024

Bâtiment 1 : l'équipe du chef maçon Mr Gérard vient de faire le cimentage de la dernière salle de classe.

Bâtiment 2 : La véranda vient d'être cimentée.

Au niveau des toilettes, quelques pots du wc sont placés et cimentés.



Vendredi 1^{ère} mars 2024

Bâtiment 1 : La véranda est nivelée, piquetée à niveau, arrosée, (préparée pour le cimentage) et les pots de fleur devant véranda sont en train d'être crépis.

Bâtiment 2 : Les marches d'entrée en salle sont en train d'être crépies pour les entrées du salle 2,3, et 4.

Au niveau des toilettes : Le crépissage interne des cabines et aussi le crépissage des murs de la clôture continuent.



Samedi 02 mars 2024

Bâtiment 1 : Le cimentage de toute la véranda est réalisé avec ses flancs. Les poteaux de la rampe ont été coffré puis coulés en béton armé.

Bâtiment 2 : Les poteaux de la rampe ont été coffré puis coulés en béton armé. Le crépissage des marches d'entrée devant une salle est fait, ainsi les pots de fleur de la devanture du bâtiment sont crépis.

Au niveau des btoilettes : le crépissage interne et frontal évoluent.



Lundi 04 mars2024

Bâtiment 1 : le marches d'entrée et les poteaux de la rampe sont crépis.

Bâtiment 2 : les poteaux de la rampe sont en train d'être crépis.

Au niveau des toilettes : les cabines internes sont crépis et les pots des wc sont en train d'être placés.





Mardi 05 mars 2024

Bâtiment 1 : les restes des poteaux de la rampe sont crépis. Le cimentage de la rampe est réalisé.

Bâtiment 2 : les poteaux de la rampe sont en train d'être crépis. Pour fermer le haut de la toiture les maçons ont passés la 1^{ère} couche du ciment mélangé avec du sikalite et du sikalatex.



mercredi 06 mars 2024

Bâtiment 1 : La fermeture du haut de la toiture du bâtiment est en train d'être réalisé avec du ciment mélangé du sikalite et du sikalatex pour empêcher l'eau de la pluie de filtrer.

Bâtiment 2 : Le cimentage de la rampe est réalisé.

Au niveau des toilettes : le crépissage de la clôture est en train d'être réalisé, et la porte d'entrée dans l'espace des douches des filles est placée.



Jeudi 07 mars 2024

Bâtiment 1 : La fermeture du haut de la toiture du bâtiment est achevée.

Bâtiment 2 : La fermeture du haut de la toiture du bâtiment est réalisé avec du mélange du sikalite et du sikalatex au ciment comme fait pour le bâtiment 1.

Au niveau des toilette : les maçons sont en train de crépir la clôture.



Vendredi 08 mars 2024

Bâtiment 1 et 2 : Les petits travaux qui restaient sur les bâtiments ont été faits (il s'agit des fixations des calles des portes et des fenêtres par exemple)

Au niveau des toilettes : Le remblayages de l'espace entre les deux blocs de toilettes est réalisé.



Samedi 09 mars 2024

Au niveau des toilettes : le crépissage continue pour le reste des murs.

La porte d'entrée dans l'espace des toilettes des élèves garçons est montée puis serrée.

Pour les deux bâtiments du CEG, un pré-nettoyage a commencé.



Lundi 11 mars 2024

Au niveau des toilettes : Les cours des deux blocs (garçons et filles) ont été cimentées par les maçons des deux équipes du chantier.

NB : Dans la soirée, le président du conseil d'administration de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITE Mr Benoit D. AHLONSOU et la directrice exécutive Mme TODA ont visité le chantier pour voir l'évolution des travaux.



Mardi 12 Mars 2024

Les pots de fleurs autour des toilettes ont été crépis dans la soirée.

Pour les 02 bâtiments du CEG, le pré-nettoyage suit son cours.



Mercredi 13 Mars 2024

Les carreleurs ont monté les carreaux dans les douches des élèves filles.




Jeudi 14 Mars 2024

Le plombier a monté les lave mains et les autres accessoires de la douche.



jeudi 14 mars 2024

Le plombier installe le lavabo et autres accessoires de douche.

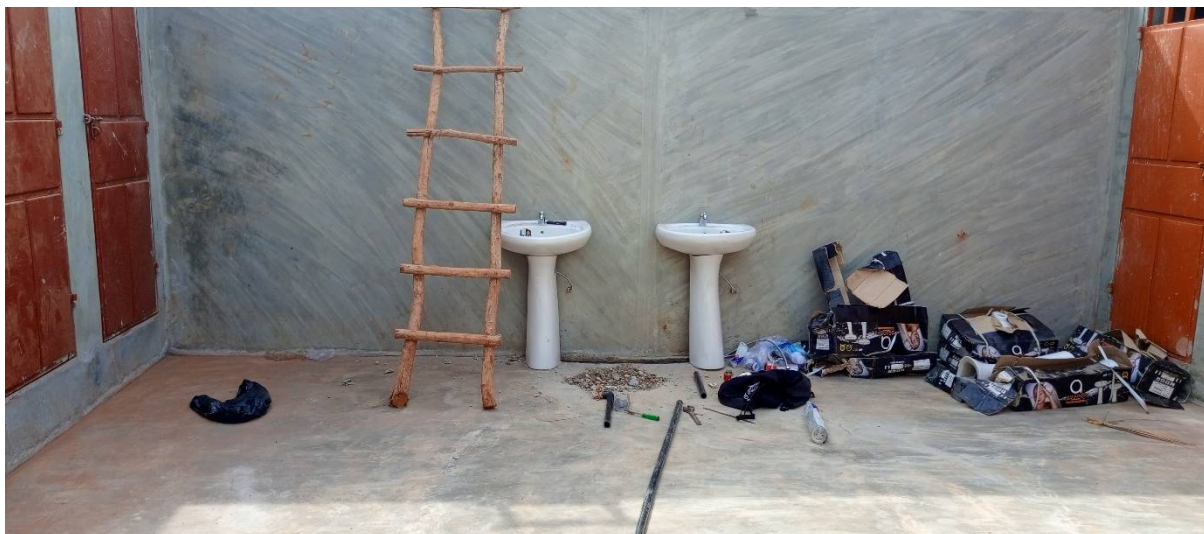

Les bâtiments et les toilettes attendent désormais le début des travaux de peinture.

Rapporteur :
Jean Azombakin
