

アボメ・カラヴィ郡 アゴンメー公立小学校

合計 6 教室、事務所、倉庫を擁する 2 棟の建物の建築 および 8 つの個室を擁する 1 棟のトイレの設置に関する 作業報告書その2

2023 年 12 月 29 日金曜日

2 棟目の左官工事は前日からすでに始まっており、2 面の妻壁に漆喰を塗りました。今日は 2 つ目の教室の 2 面の妻壁への漆喰作業が行われています。



2023 年 12 月 30 日土曜日

1 棟目では、事務室の左官工事が始まりました。
2 棟目では、2 つの側壁が漆喰で塗られています。
盗難防止用の装置が納品されました。

2024 年 1 月 3 日水曜日

新年のお祝いが終わると、レンガ工たちは足場を新しくし、仕事始めの準備を整えました。

2024 年 1 月 4 日木曜日

1 棟目の事務室の漆喰作業が終わりました。物置では 3 面の漆喰仕上げが完了しました。
2 棟目ではベランダ内の工事が始まりました。3 つのセクションに漆喰が塗られました。

2024 年 1 月 6 日土曜日

1 棟目では、1 つめの教室の妻壁 2 面を塗装し、2 棟目では後壁にシカリットとシカラテックスが塗られています。



2024 年 1 月 8 日 月曜日

- 1 棟目の 2 番目の教室で漆喰作業が行われています。
- 2 棟目では、側壁にシカリットとシカラテックスが塗られています。



2024 年 1 月 9 日 火曜日

- 1 棟目: 2 つ目の教室は漆喰塗りが完了、3 つ目の教室の妻壁も漆喰塗り中です。
 - 2 棟目: 外側のもう片方の妻面がシカリットとシカラテックスで漆喰仕上げされています。
- ベランダでも作業中です。

夕方、NPO の会計担当者が工事現場に来て、工事の進捗状況を確認しました。

女性たちは再びやって来て、残りの充填作業を終えました。

2024 年 1 月 10 日 水曜日

- 1 棟目: 3 つ目の教室の左官工事が進められています。
- 2 棟目: 外壁の塗装が完成しました。窓とドアの枠が整えられます。また、3 本の支柱が漆喰で仕上げられています。



2024 年 1 月 12 日金曜日

1 棟目: 背面全体と側壁の半分の漆喰塗りをしました。

2 棟目: ベランダ内の壁 3 面と支柱 4 本に漆喰を塗ります。黒板が持ってこられました。

鍵屋はスロープに手すりを取り付けます。



2024 年 1 月 13 日土曜日

1 棟目: 外の側壁に漆喰が塗られます。ベランダ内の壁 3 面、支柱 3 本も塗装されました。

2 棟目: 支柱 4 本と建物後部の屋根の張り出し壁 4 面が漆喰で仕上げられています。



2024 年 1 月 15 日月曜日

1 棟目:ベランダの壁 3 面と、2 面の妻面に漆喰が塗られます。

2 棟目:ベランダ内の支柱が塗装されました。



2024 年 1 月 16 日火曜日

トイレが左官工事中です。

1 棟目はベランダの壁の一部を、2 棟目ではすべての支柱が塗装されています。



2024 年 1 月 17 日水曜日

トイレの個室の左官工事が進められています。

教室の床が圧縮され、コンクリートを流す準備が整います。



2024 年 1 月 18 日木曜日

1 棟目:土床の圧縮が完了し、平らにならされ、印が付けられます。

2 棟目:2 教室の床がコンクリートで仕上げられました。

2024 年 1 月 19 日金曜日

1 棟目:事務所と倉庫の床が打設されています

2 棟目:3 つ目の教室とベランダの床がコンクリートで仕上げられました。

夕方には砂利が届きます。



2024 年 1 月 20 日土曜日

両方の建物のスロープの柱が打設されました。

トイレの正面が漆喰で仕上げられています。

1 棟目: 2 教室の床が完成しました。

2 棟目: 階段の左官作業とコンクリート仕上げがされました。

2024 年 1 月 23 日火曜日

1 棟目: 3 教室の床とベランダのコンクリート仕上げが完了しました。

花壇の壁は漆喰で仕上げられています。

夕方、会計係とマネージャーが建設現場に来ます。



2024 年 1 月 24 日水曜日

1 棟目のスロープと階段がコンクリートで仕上げられました。



便座が設置されてました。



2024 年 1 月 25 日木曜日


2 棟目のスロープもコンクリートで仕上げられました。2 つの屋根の切妻はシカリットとシカラテックスで防水加工されます。



2024 年 1 月 26 日金曜日

トイレには排気管が設置されています。階段が施工されました。

盗難防止用の装置が設置されています。

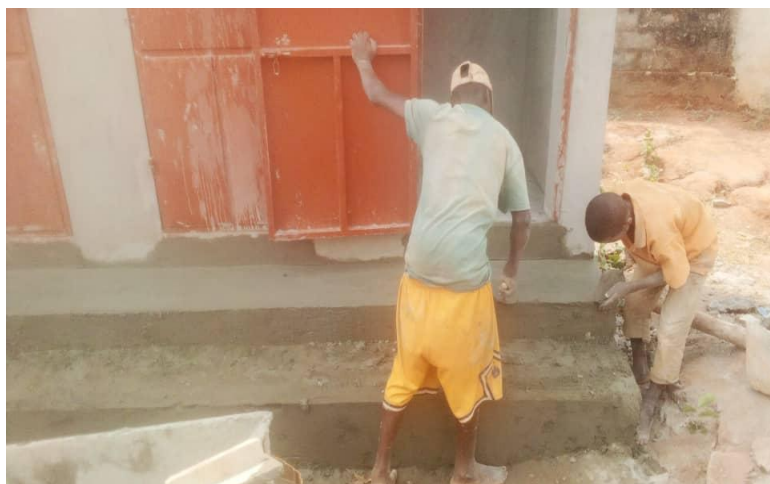

2024 年 1 月 27 日土曜日

事務室と倉庫に 3 つの面格子が設置されました。



2024 年 1 月 29 日月曜日

細かい修正が引き続き行われています。

工事監督は工事現場の清掃を始めました。

2024 年 1 月 31 日水曜日

全ての大工工事が完了しました。



建物は今、色が変わるのを待っています。

報告者:

ロコ・ジョセフ
