

**2EME RAPPORT DES TRAVAUX DU CHANTIER DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
POUR LA TRANSFORMATION DES NOIX DE KARITE PAR L'ONG ACTIONS DE
SOLIDARITE AUX FEMMES DU VILLAGE ASSODE DANS LA COMMUNE DE OUAKE**

Mercredi, 14 juin 2023

Vers 7 h environ les électriciens ont poursuivi les travaux d'installations des files électriques, les câbles de terre, les boitiers et coffrets sur le bâtiment pour que dans la nuit les femmes peuvent travailler à l'aide d'éclairage électrique si possible ou à l'aide d'un groupe électrogène.

Les électriciens ont terminé la 1ère phase d'installation et la phase finale se fera après la finition du bâtiment par les maçons dans quelques jours.




Lundi, 19 juin 2023

Les maçons sont revenus sur le chantier pour commencer le crépissage du bâtiment, pour le compte d'aujourd'hui deux murs dans l'intérieur du bâtiment sont crépis sans l'aide de l'équipe de la population. Mais quelques-unes des femmes étaient présentes pour apporter de l'eau que les maçons ont utilisé.




Mardi, 20 juin 2023

Très tôt le matin la pluie a commencé, mais vers 11 h les maçons commencent les travaux de crépissage et quelques murs de l'intérieure du bâtiment ont été faits sans l'aide de l'équipe des hommes d' Assodè. Ils ne sont pas venus parce qu'aujourd'hui est le jour de leur maché Kassoua qui a lieu tous les Mardi, c'est à dire une seule fois par semaine. Mr. Idrissou Yolou a fait tout le possible pour que les maçons ont trouvé de l'eau pour travailler.

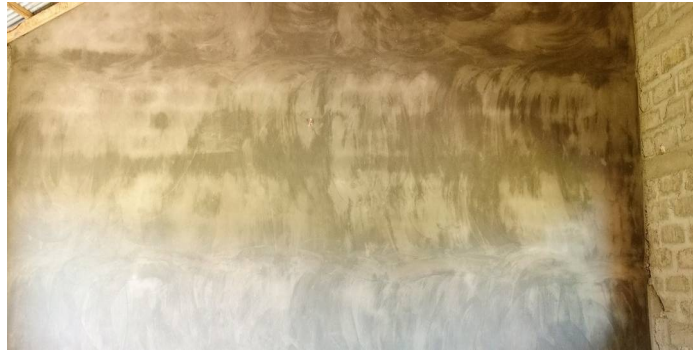

Mercredi, 21 juin 2023

Ce matin la pluie a empêché les maçons de travailler sur le chantier jusqu'à 11 h. Pour le compte de la journée les maçons ont crépi les deux faces extérieures des pignons du bâtiment avec un mélange de sikalite pour empêcher la pénétration de l'eau en temps des pluies. L'équipe désigné pour représenter la population pour aider les maçons est absente, homme comme femme, parce qu'il y a eu la pluie et ils sont tous partis aux champs. Encore une fois Mr. Idrissou Yolou et un jeune homme ont trouvé de l'eau pour les maçons pour travailler sur le chantier à l'aide d'une moto tricycle.

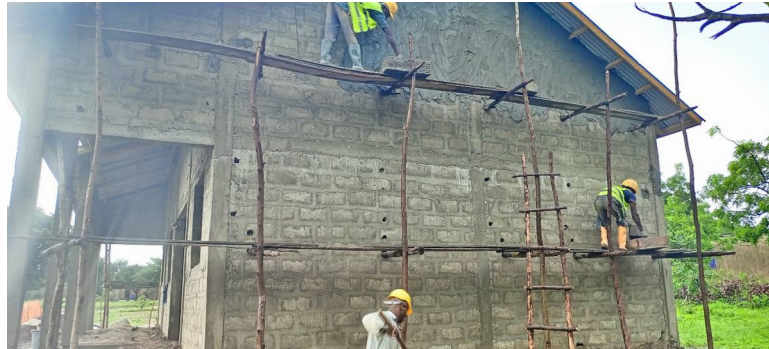

Jeudi, 22 juin 2023

Vers 4 h le matin Mr. Benoit D. Ahlonsou, le Président de l'ONG Actions de Solidarité, M. Armand Agossa, le trésorier de l'ONG, et M. Christian, le chauffeur, sont arrivés sur le chantier pour une visite de contrôle des travaux du bâtiment. Ensemble avec la délégation de l'ONG les portes et les fenêtres sont livrées. Vers 6 h à 9 h environ il y avait la pluie. Après la pluie l'équipe de visite a pris la route pour le retour à Calavi. Les maçons ont commencé de travailler et ont placé toutes les portes et fenêtres du bâtiment.



Vendredi, 23 juin 2023

Vers 8 h les travaux du crépissage se poursuivent très bien sur les côtés extérieurs et intérieurs du bâtiment, et comme les aides maçons ne sont pas venus, les femmes ont appelé une délégation pour représenter l'équipe de la population sur le chantier, pour que, à partir de maintenant, les tâches qui les concernent évoluent bien. Après la réunion les femmes sont allées puiser de l'eau et l'ont apporté sur le chantier, et deux hommes ont aidé les maçons.



Samedi, 24 juin 2023

A partir de 8 h les travaux du crépissage avancent très bien sur le côté de la véranda du bâtiment. L'équipe de la population est présente sur le chantier pour apporter de l'eau.

Dimanche, 25 juin 2023


Les travaux de crépissage se poursuivent très bien sur le chantier par l'équipe de la maçonnerie, à sa tête Mr Bruno, et l'équipe de la population aussi est présente pour apporter

de l'eau aux maçons sur le chantier, mais l'équipe des hommes de la population qui devait aider les maçons est absente.



Lundi, 26 juin 2023

Sur le chantier aujourd'hui la finition de quelques poteaux sur le bâtiment est réalisée, au niveau de quelque fenêtres leurs finitions aussi est réalisé. L'équipe des femmes de la population est présente pour qu'il n'aura pas de manque de l'eau sur le chantier, mais les hommes sont absents.

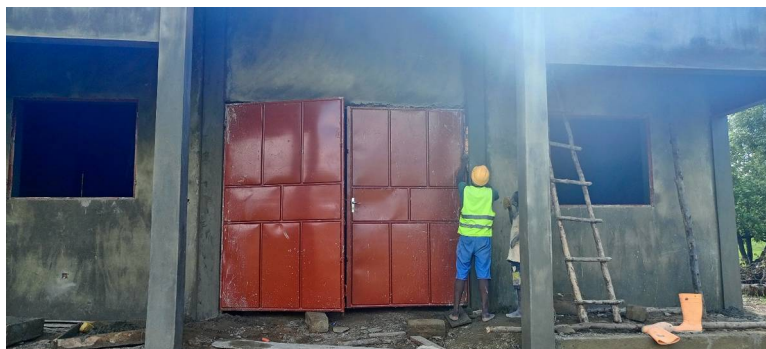

Mardi, 27 juin 2023

Le crépissage (la finition) du bâtiment continuent très bien. Au niveau des fenêtres restantes et des portes le travail de la finition est en train d'être fait. L'équipe des aides maçons n'est pas arrivée, mais les femmes sont passé pour apporter de l'eau aux maçons avant d'aller au marché de Kassoua.



Mercredi, 28 juin 2023

Très tôt ce matin les maçons ont commencé par dresser le sol des deux petites chambres du bâtiment et la véranda et leurs cimentages est fait. L'équipe femmes est venu pour apporter

de l'eau, puis elles sont réparties chez elles pour préparer la fête de la Tabaski, mais au niveau de l'équipe des hommes personne n'est venu.



Jeudi, 29 juin 2023

Très tôt ce matin les maçons ont commencé par redresser la grande salle du bâtiment pour la réalisation du cimentage. L'équipe des hommes est représentée par quatre jeunes et en plus l'équipe des femmes apporte de l'eau sur le chantier. Ensemble le travail du cimentage est fait.



Vendredi, 30 juin 2023

Pour le compte de la journée les maçons ont cimenté la rampe de la porte de l'entrée principal du bâtiment. Les marches pour accéder le bureau sont crépies, ainsi que les pots de fleurs de la devanture du bâtiment. Les grilles antivole sont placés au niveau du bureau et du magasin.



Samedi, 1 juillet 2023

Le chef maçon M. Bruno a pris cette journée pour vérifier tout autour du bâtiment pour voir s'il y a des erreurs sur le bâtiment à corriger. Des mineurs corrections sont faites. Ensuite ils ont procédé aux nettoyages de leurs matériaux de travail pour les ranger.



Dimanche, 2 juillet 2023

M. Roméo, chef électricien, est arrivé sur le chantier avec son collaborateur pour installer des panneaux solaires, des ampoules, les interrupteurs, et les prises sur le bâtiment.



Lundi, 3 juillet 2023

Cette journée est le retour de toutes les équipes qui interviennent sur le chantier de construction d'un bâtiment pour abriter les machines de transformation des noix de karité en beurre par l'ONG Actions de Solidarité au profit des groupement des femmes du village d'Assodè. L'équipe de la peinture sera sur le chantier dans les jours à venir pour faire la peinture du bâtiment.



Rapporteur :
Jean Azombakin
