

Arbeitsbericht zum Bau eines neuen Gebäudes mit drei Klassenräumen, Büro, Lagerraum und Toiletten für die öffentliche Grundschule von Golo-Missébo Gruppe C Gemeinde von Abomey-Calavi

Am 1. September 2020 haben wir uns mit dem Elternbeirat und Leuten aus der Bevölkerung zu einer Großversammlung getroffen, um die Bauarbeiten für das neue Gebäude für die Grundschule von Golo-Missébo loszutreten. Der Vertarg wurde vorgelesen, Fragen beantwortet und danach abgestimmt.



Als ich anschließend den Baubeginn für den darauffolgenden Tag erklärte, waren die Leute sehr erstaunt. Sie zweifelten, ob ich es ernst meinte.

Nachdem wir uns getrennt haben, bestellte ich Sand, Kies, Eisen und Zement. Am 2. September wurde alles geliefert, während wir dabei waren, den Baugrund zu vermessen.




Die ersten Bausteine wurden gemacht.



Die Arbeit nahm Wind auf und in nur 2 Monaten war das Gebäude fertig



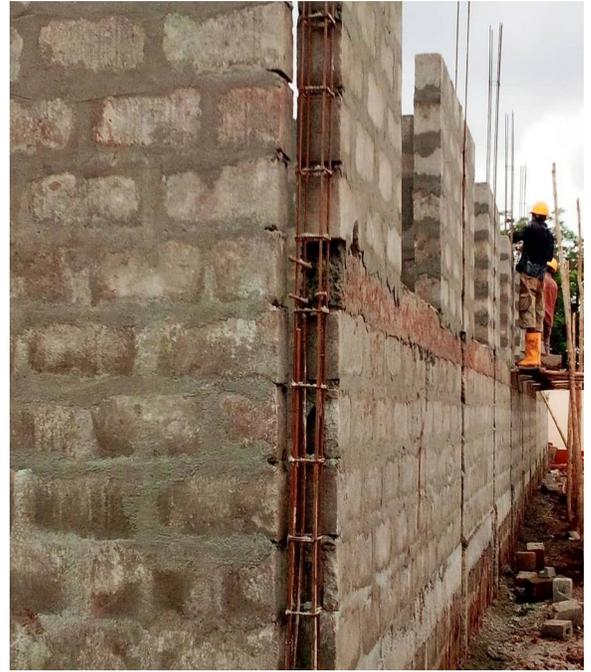



Während die Mauern trocknen, wird die Rampe angelegt und die Leute aus dem Dorf heben die Toilettengrube aus.





Nachdem die Mauern des Gebäudes gut getrocknet sind, fertigen die Zimmerer den Dachstuhl und legen die asbestfreien Eternitplatten auf.



Und schon beginnen die Maurer die Wände des Gebäudes zu verputzen.



Die Rampe wird zementiert.

Die Maler kommen zur Baustelle.



Kinder räumen um das neue Schulgebäude auf.



Ein wunderschönes Gebäude und ein einladendes Toilettenhäuschen.

Ich danke allen Unterstützern, dem BMZ und dem Bildungswerk Westafrika e.V. für die beständige Zusammenarbeit.

Mit lieben Grüßen aus Benin

Astrid Toda

Ich hänge noch ein Bild an, das einen Ausblick aus luftiger Höhe bietet.

